



TÜRKİYE: DEPREM SONRASI İYİLEŞME VE YENİDEN İMAR PROJESİ (TERRP)

**ELBİSTAN KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKE PROJESİ
(1. KISIM)
ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI (ÇSYP)**

AĞUSTOS 2024

İçindekiler

İçindekiler

1. GİRİŞ	1
1.1. Proje Bilgileri.....	3
1.2. Hedefler.....	4
2. YASAL VE KURUMSAL ÇERÇEVE	6
3. ROLLER VE SORUMLULUKLAR.....	6
4. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI MATRİSİ	9
5. PAYDAŞ KATILIMI.....	28
6. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM KONTROLLERİ	29
7.EĞİTİM	30
8. İZLEME VE RAPORLAMA	32
9. UYGULAMA TAKVİMİ VE BÜTÇE KAYNAKLARI	33
10. EKLER	35
10.1. Elbistan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri Yerleşim Planları	36
10.2. İzinler	37
10.3. Paydaş Katılımı ve Halkın Bilgilendirilmesi Toplantı Tutanağı	38
10.4. Şikayet Formları	55

Tablo Listesi

Tablo 1: Roller ve Sorumluluklar.....	7
Tablo 2: Planlama, İnşaat ve İşletme Aşamaları için Çevresel ve Sosyal Etki Yönetim Planı	11
Tablo 3: ÇSYP Bütçe Kaynakları	31
Tablo 4: Proje Uygulama Zaman Çizelgesi	32

Şekil Listesi

Şekil 1. Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi Elbistan'ın Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi	1
Şekil 2: Elbistan İlçesinin Konumu	2
Şekil 3: Projenin ve Elbistan İlçesinin Konumu	5


1. GİRİŞ

Dünya Bankası tarafından desteklenen ve İLBANK tarafından uygulanan Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden İmar Projesi (TERRP), deprem bölgesi ilan edilen illerde temel belediye hizmetlerinin iyileştirilmesini ve bu hizmetlere erişimin yeniden sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu proje kapsamında Elbistan ilçe merkezinde 1993 yılında inşa edilen ve depremde zarar gören mevcut atıksu şebekesinin yenilenmesi hedeflenmektedir. İlçede yağmursuyu şebekesinin bulunmaması, yağışlarla gelen suyun atıksu şebekesi üzerinden atıksu arıtma tesisine taşınmasına neden olmaktadır. Alt proje ile atıksu ve yağmursuyu şebekesi ayrı sistemler olarak inşa edilecek. Alt projenin 1. Etapı kapsamında Ø200 ile Ø500 çapları arasında değişen beton borular ve koruge borular ile 121.615 m atıksu şebekesi, Ø300 ile Ø1600 çapları arasında değişen beton borular ve 800x600 ve 2000x1500 kesitli beton kutu kanallar ile 18.889 m yağmursuyu şebekesi inşa edilmesi hedeflenmektedir.



Şekil 1. Elbistan'ın Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi

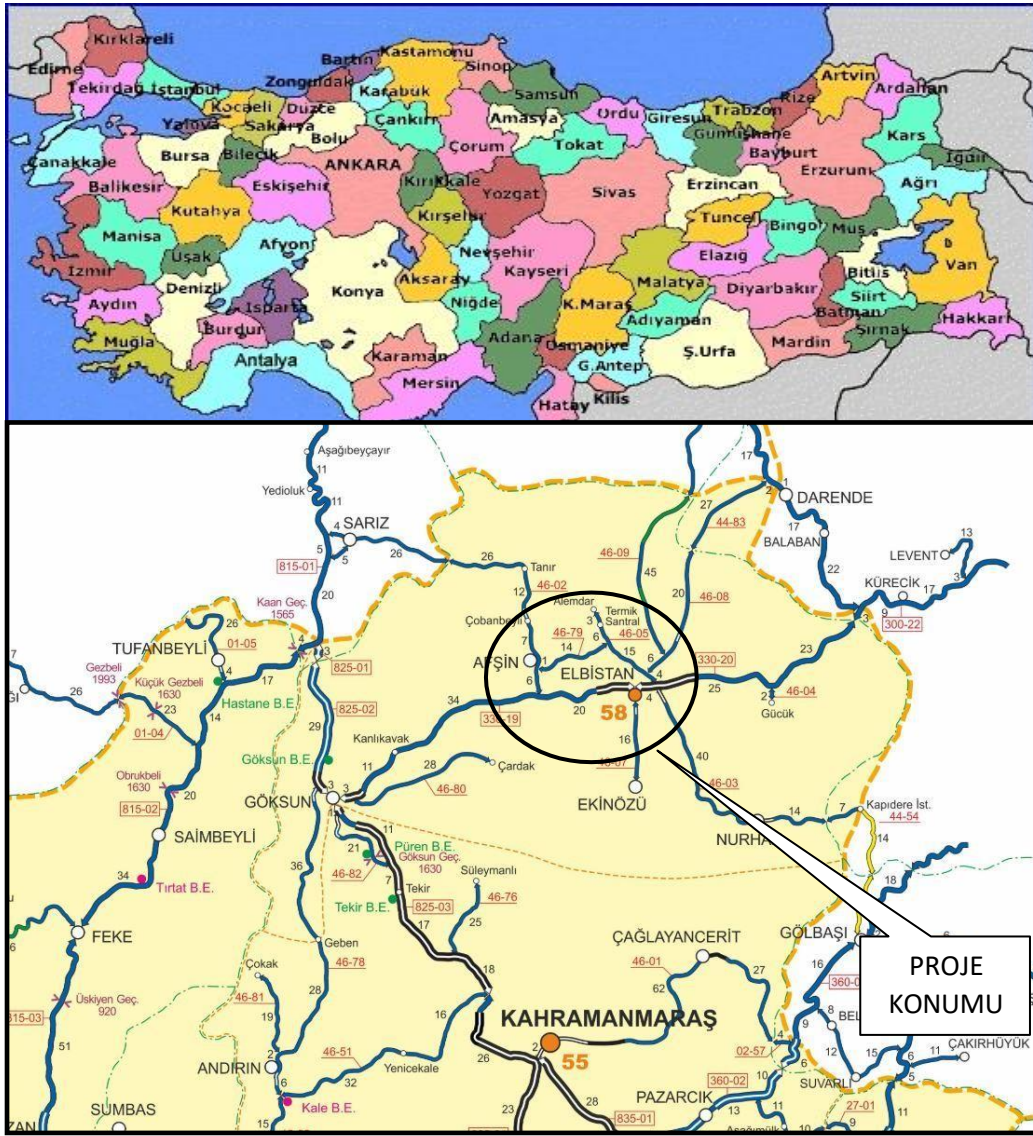

Şekil 2. Elbistan İlçesinin Konumu

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Elbistan İlçe merkezindeki kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinin yenilenmesine yönelik alt proje faaliyetlerinin çevresel ve sosyal risk ve etkilerini belirlemek ve bu risk ve etkileri yönetmek için uygun etki azaltıcı önlemleri önermek amacıyla hazırlanmıştır.

Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi inşaat işleri için çevresel ve sosyal risklerin geçici ve sahaya özgü olması beklenmektedir. Bu çevresel ve sosyal riskler, iyi inşaat uygulama kılavuzları ve bu ÇSYP'de tanımlanan etki azaltma önlemleri uygulanarak azaltılabilir. Elbistan'ın mevcut altyapısı 1993 yılında İLBANK tarafından inşa edilen kanalizasyon şebekesinden ve nüfus artışı ve ihtiyaca göre belediye tarafından projeye eklenen ilave kanalizasyon hatlarından oluşmaktadır. İlçede ayrı bir yağmursuyu şebekesi bulunmamaktadır ve sokak ve caddelerden toplanan yağmursuları kanalizasyon şebekesi üzerinde ek bir yük oluşturmaktadır. Alt proje, 1993 yılında İLBANK tarafından inşa edilen kanalizasyon şebekesi ile aynı güzergah üzerinde inşa edileceğinden, herhangi bir kamulaştırma veya ekonomik/sosyal yerinden edilme söz konusu olmayacaktır. TERRP Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi'nde tanımlanan proje inşaat faaliyetleri ile ilişkili potansiyel çevresel ve sosyal riskler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

- Hava kirliliği (toz, koku, araç egzozu, vb.)
- Gürültü ve titreşim

- Toprak kirliliği
- Su kirliliği
- Tehlikeli ve tehlikesiz atık yönetimi
- Çalışma ve çalışma koşulları (İşgücü Yönetimi)
- Kamu hizmetlerinde ve altyapıda aksamalar
- Trafik güvenliği riskleri
- İSG
- Toplum sağlığı ve güvenliği konuları
- Arazi kullanımının kısıtlanması, geçim kaynaklarının kaybı, hassas grupların potansiyel olarak dışlanması.

1.1. Proje Bilgileri

Elbistan, coğrafi sınırlarının uzandığı Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin kesiştiği noktada yer almaktadır. Kuzeyde Darende-Gürün, güneyde Nurhak-Ekinözü, doğuda Malatya ilinin Doğanşehir ilçesi, batıda Afşin ve Göksun yerleşim merkezleri ile çevrilidir. Elbistan İlçe merkezinde Bahçelievler, Battalgazi, Ceyhan, Cumhuriyet, Esentepe, Güneşli, Kızılcaoba ve Köprübaşı mahalleleri bulunmaktadır.

Elbistan ilçe merkezindeki mevcut atıksu şebekesi 1993 yılında İLBANK tarafından inşa edilmiştir. Artan nüfus ihtiyaçları doğrultusunda Elbistan Belediyesi tarafından sisteme ilave atıksu hatları eklenmiştir. Atıksu şebekesinin çok eski olması ve depremten dolayı ağır hasar görmesi nedeniyle mevcut hattın düzgün çalışmadığı ve kaçaklara neden olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca ilçe merkezinde yağmursuyu şebekesi bulunmadığından yağışlardan gelen suyun büyük bir kısmı atıksu şebekesine aktarılmaktadır. Dolayısıyla atıksu arıtma tesisine aktarılan atıksu miktarında artışa neden olmaktadır. Alt proje kapsamında ayrı sistemler olarak tasarlanacak atıksu ve yağmursuyu şebekeleri ile atıksu miktarı azaltılacak, atıksu arıtma tesisine ek yük getirilmeyecektir.

Alt proje kapsamında öncelikle 1. etap şebeke hatlarının yapılması planlanmaktadır. Deprem nedeniyle ağır hasar gören altyapı hizmetlerinin eski haline getirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesini amaçlayan alt proje kapsamında Elbistan ilçe merkezinde çapları Ø200 - Ø500 arasında değişen beton borular ve koruge borular ile 121.615 m atıksu şebekesi, çapları Ø300 - Ø1600 arasında değişen beton borular ile 18.889 m yağmursuyu şebekesi ve 800x600 ve 2000x1500 kesitli beton kutu kanallar yapılması planlanmaktadır.

Elbistan ilçe merkezinde uygulanacak olan bu alt proje açık imar yollarından geçecek ve eski şebekenin bulunduğu güzergahlarda kazılar yapılarak şebeke yenilenecektir. Elbistan ilçe merkezinde bulunan Söğütlü Çayı'nın alt proje çalışmalarından etkilenmemesi için tüm önlemler alınacaktır. Özellikle Söğütlü Çayı yakınlarında yapılacak kazılarda yeraltı su seviyesi dikkate alınacak ve bu ÇSYP'de belirtilen drenaj önlemleri alındıktan sonra kazı çalışmalarına başlanacaktır. Ayrıca inşaat çalışmaları sırasında yeraltı suyunun boru döşeme çalışmalarına, iş sağlığı ve güvenliğine, doğal yaşam alanlarına ve toprak erozyonuna neden olmasını önlemek amacıyla Tablo 2'de belirtilen etki azaltıcı önlemler yüklenici tarafından uygulanacak ve proje süresince danışman tarafından kontrol edilecektir.

Yerel halkın günlük yaşamını etkilemesi muhtemel alt proje çalışmaları başlamadan önce KASKİ, Müşavir ve Yüklenici tarafından projeye ilişkin farkındalık artırma faaliyetleri yürütülecektir. Alt proje görünürlük çalışmaları ile birlikte ilçede yaşayan topluluklarla istişare toplantıları ve halkın katılımı toplantıları düzenlenecek ve alt proje tanıtılacaktır. Proje uygulama aşamasında ibadethane, okul, hastane gibi hassas alanlarda ilçede yaşayan halkın günlük yaşamını aksatmayacak bir çalışma planı yapılacaktır. Özellikle ilçe merkezindeki tarihi değere sahip ibadethanelerden Himmet Baba Camii çevresinde yapılacak kazı çalışmalarında yerel halkın bu alana girmesini engellemeyecek şekilde çalışma planları yapılacaktır. Yüklenici çalışmalara başlamadan önce o bölgede yaşayan topluluklar çalışmalar hakkında bilgilendirilecek. Böylece ilçede yaşayan topluluklar alt proje hakkında bilgilendirilecek ve endişeleri giderilecektir.

Yüklenici, alt proje inşaat aşamasında ÇSYP'deki kılavuzlara uygun olarak etki azaltma önlemlerini içeren alt yönetim planlarını hazırlayacak ve danışman kontrolünden sonra onay için İLBANK PUB'a sunacaktır. Ayrıca, bu alt yönetim planlarını (örneğin su kirliliği kontrolü, trafik yönetim planı, paydaş katılım planı, İSG, gürültü-toz kontrolü yönetim planları ve halk sağlığı ve güvenliği yönetim planı vb) sahada izlemek için proje süresince uzmanlar görevlendirilecektir. Alt proje personeli bu yönetim planları çerçevesinde düzenli olarak eğitilecek ve proje etki azaltma önlemlerine uygun olarak çalışmaları sağlanacaktır.

1.2. Hedefler


TERRP Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi kapsamında, bu ÇSYP, Çevresel ve Sosyal (Ç&S) Tarama sonrasında bu alt proje için geliştirilmiştir. Ç&S Risk Derecelendirmesi, öngörülen Ç&S riskleri ve etkilerine dayalı olarak "Orta" olarak değerlendirilmiştir. Bu tarama değerlendirmesine göre, bu ÇSYP, bu proje alanına özgü riskleri ve azaltma önlemlerini kapsayan ve kapsayıcı ÇSYÇ ile uyumlu olarak bu proje için hazırlanmıştır.

Alt projenin inşaat aşamasında Elbistan'da yaşayan yerel halkın hakları korunacak ve farkındalık yaratılarak tüm paydaşların proje sürecine katılımı sağlanacaktır. İlçe merkezinde günlük yaşam döngüsünü aksatmayacak şekilde proje güzergahı üzerinde bulunan işyerlerinin ve esnafın ticari faaliyetlerini engelleyecek önlemler alınarak çalışmalar yürütülecektir. Özellikle projede istihdam edilen ve farklı illerden gelen işçilere Elbistan yerel halkının kültürüne uygun davranmaları için Yüklenici uzmanları tarafından Davranış Kuralları eğitimleri verilecektir.

Alt projenin Elbistan ilçe merkezinde ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki etkilerini azaltmak için her türlü tedbirin alınması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve iş güvenliği tedbirlerinin alınmasının ardından çalışmalara başlanacaktır. Böylece ilçe merkezinde ulaşım ve trafik sorunlarının yerel halk üzerindeki etkisini en aza indirecek bir iş planı hazırlanacak ve çalışmalara başlanacaktır.

Bu ÇSYP, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi projesinin geliştirileceği ve uygulanacağı 1. Aşama alanındaki riskler ve bulgular (1. Aşama proje alanı Şekil 2'de yeşil renkli alanlar olarak gösterilmiştir) ve yararlanıcının kapasitesi gibi bilgilere dayanarak önerilen projenin risklerini ve etkilerini değerlendirmiştir. Risk ve etkilerin değerlendirilmesi, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) ve ulusal mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Risk tanımlama, azaltma ve izleme faaliyetleri, projenin iki ana aşaması olan "Arazi Hazırlığı ve İnşaat" ve "İşletme" için değerlendirilmiştir. Bu ÇSYP, tüm çevresel ve sosyal önlemleri özetleyen ve projenin tüm taraflarının uymakla yükümlü olduğu bir çerçeve belgedir. Proje ilerledikçe, bu belge sürekli olarak gözden geçirilecek ve aşağıda belirtilen değişiklikler doğrultusunda güncellenecektir:

- Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlardaki değişiklikler,
- Detaylı tasarım ve ihale dokümanı hazırlama aşamalarında proje tasarım parametrelerinde meydana gelebilecek değişiklikler,
- İzleme sonuçları ve
- Projenin işletme aşamasında gerçekleştirilen test ve denemelerin sonuçları.

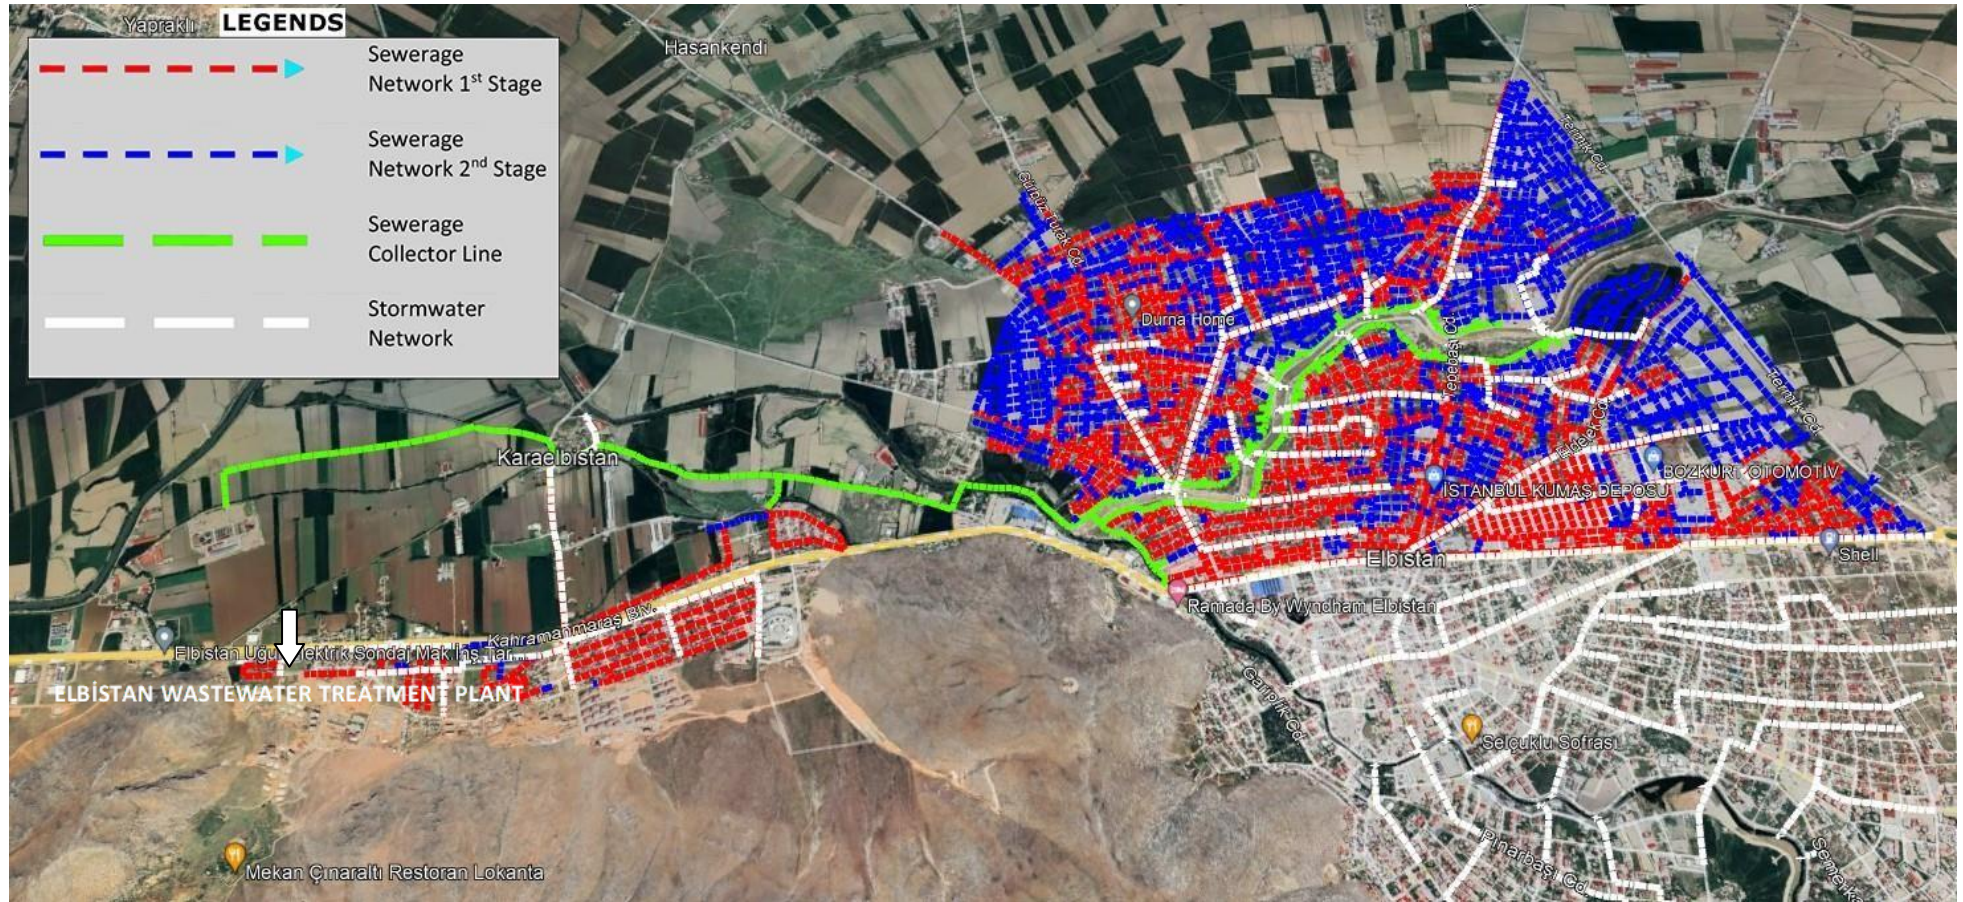

Şekil 3. Projenin ve Elbistan İlçesinin Konumu

2. YASAL VE KURUMSAL ÇERÇEVE

Teklif Edilen Projenin çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik boyutlarının yönetimi için geçerli olan Ulusal Mevzuat bu bölüm altında açıklanmaktadır. 11.08.1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve daha sonra 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete'de revize edilen 2872 sayılı Çevre Kanunu (6486 sayılı Kanun) Türkiye'deki çevre mevzuatının temel yasal çerçevesini oluşturmaktadır ve büyük ölçüde AB ÇED Direktifi ile uyumludur. Bu kanun çok sayıda yönetmelikle desteklenmektedir. Alt proje uygulama aşamasında ulusal yasa, yönetmelik ve mevzuatların yanı sıra uluslararası standartlara da uyulması gerekmektedir. Dünya Bankası çevresel ve sosyal standartları projenin tüm aşamalarında, özellikle de Proje'nin ÇSYÇ'sinde açıklanan etki azaltma sürecinde takip edilecek ve uygulanacaktır (ÇSYÇ için lütfen aşağıdaki bağlantıyı takip edin).

https://www.ilbank.gov.tr/storage/uploads/uidb/ilbank_terrp_esmf_wb_comments_01032024_tr_pdf_1709909725.pdf.

3. ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Yüklenici, Müşavir, KASKİ ve İLBANK'ın alt proje hazırlık, inşaat ve işletme aşamalarındaki görev ve sorumlulukları aşağıdaki Tablo 1'de tanımlanmıştır. Bu rol ve sorumluluklar Elbistan ilçe merkezinde inşa edilecek olan Atıksu ve Yağmursuyu Şebeke Projesi için belirlenmiştir. Burada belirtilen roller, çevresel ve sosyal sorumluluklar, inşaat faaliyetleri, raporlama ve paydaş katılımı vb. konularda kuruluşların ve şirketlerin görevlerini belirlemek ve bu sorumluluklara uymalarını sağlamak amacıyla tanımlanmıştır.

Tablo 1. Roller ve Sorumluluklar

Roller	Sorumluluklar
Yüklenici	- Yüklenici, bu ÇSYP'de belirtilen sorumluluklarına bağlı olacaktır. - Yüklenici, İSG Planı gibi alt yönetim planlarını ve prosedürlerini hazırlayacak ve inşaat işlerinden önce İLBANK PUB'a/denetim danışmanına sunacaktır. - Yüklenici, ulusal yönetmeliklere ve DB'nin ÇSS'lerine uyum için bu ÇSYP kapsamındaki görev ve sorumluluklarının farkında olacaktır. - İnşaat yüklenicisi, ÇSYP ve ÇYP'nin uygulanması konusunda işçilere talimat vermek ve tavsiyelerde bulunmak üzere tam zamanlı bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uzmanı, tam zamanlı bir çevre uzmanı ve tam zamanlı bir sosyal uzman istihdam edecektir. Yüklenicinin, ESİRT yönergelerine uygun olarak, uzuv kaybı, ölüm veya 3 günden fazla hastanede kalmayı gerektiren herhangi bir durum gibi ciddi bir sağlık olayı olması halinde, 24 saat içinde Denetim Danışmanı/PMC (uygun olduğu şekilde) aracılığıyla doğrudan İLBANK'a rapor vermesi gerekmektedir. - İnşaat aşamasında yüklenici, çevresel ve sosyal farkındalığı artırmak için DB'nin ÇSS'leri ve ulusal yönetmelikler uyarınca çalışanlarına çevresel ve sosyal konularda (İSG dahil) düzenli eğitimler verecektir. - Yüklenici, alt proje sırasında karşılaşılan sorunları çözmek ve işleyişini sağlamak için bir şikayet mekanizması kuracaktır. Şikayet Mekanizmasının erişilebilir, işlevsel ve iyi yönetilebilir olması sağlanmalıdır. - Yüklenici, adil çalışma koşulları ve ayrımcılık yapmama da dahil olmak üzere çalışma standartları oluşturmali ve Elbistan'ın yerel halkının kültürüne aykırı davranışları önlemek için önlemler almalıdır. - Yüklenici işgücü akışını yönetecek ve mümkün olduğunca yerel istihdama öncelik verecektir. - Adil uygulamalar ve ayrımcılık yapmama dahil olmak üzere çalışma standartlarına uymaları ve yerel toplum üzerinde olumsuz etkilerden kaçınmak için işgücü akışını yönetmeleri gerekmektedir. - Kusur sorumluluk süresi boyunca inşaat yüklenicisi, geçici kabulden itibaren yeni inşa edilen tesislerin yasal düzenlemelere uygun olarak onarılmasından sorumlu olacaktır. Yüklenici, sorumluluk süresi boyunca, işletme için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planında belirtilen önlemleri uygulayacaktır. - Yüklenici, projenin ilerleyişini ve ÇSYP'ye uygunluğunu göstermek için Aylık, Üç Aylık ve Altı Aylık Çevresel ve Sosyal İzleme Raporları hazırlayacak ve danışmana sunacaktır.

Roller	Sorumluluklar
KASKİ Proje Ekibi	- KASKİ, projenin yürütülmesini kolaylaştırmak için İLBANK'ın Proje Uygulama Birimi (PUB) ile yakın koordinasyon içinde olacaktır. - KASKİ, İLBANK tarafından makul olarak talep edildiği şekilde teknik ve idari destek sağlayacaktır. - KASKİ, Yüklenici İLBANK PUB tarafından kurulan Proje Şikayet Mekanizmasını destekleyecek ve projeyle ilgili her türlü kamu endişesini gidermek için etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. - KASKİ Proje Ekibi, sözleşmenin uygulanmasındaki ilerlemenin yanı sıra sözleşme değişikliği ve sözleşmenin sonuçlandırılması ile ilgili olarak İLBANK PUB ile periyodik toplantılara katılacaktır. - Alt Projenin KASKİ'ye devredildiği tarihte, KASKİ Alt Proje varlıklarının işletilmesi ve bakımından sorumlu olacak ve Alt Proje ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü yükümlülük için yasal sorumluluğu üstlenecektir. - KASKİ Proje Ekibi, personelinin proje yönetimi, çevresel ve sosyal yönetim (ÇSYP gereklilikleri, şikayet mekanizmasının işletilmesi vb. dahil) ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmak için İLBANK PUB tarafından sağlanan kapasite geliştirme ve eğitim programlarına katılacaktır. - KASKİ'nin kendi yetkisi altındaki proje faaliyetlerini izlemesi ve ilerleme, uygunluk ve herhangi bir sorunla ilgili olarak İLBANK'a rapor vermesi gerekmektedir. KASKİ, Yüklenicinin raporu veya gözlemleri yoluyla olaylardan haberdar olduğunda derhal İLBANK PIU'ya bildirimde bulunmak zorundadır. - Gerekli UKOME kararları ve diğer izinlerden KASKİ sorumlu olacaktır. Proje kapsamında ihtiyaç duyulması halinde işleri yürütmek için. - DLP sırasında KASKİ, tespit edilen veya bildirilen kusurlar ve sorunlar hakkında İLBANK PUB'u bilgilendirecektir. - KASKİ, İLBANK PUB tarafından devredildikten sonra tüm alt proje varlıklarını yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak alt projenin ömrü boyunca çalışır durumda tutacak ve uygun şekilde kullanacaktır. - KASKİ, yeniden inşa edilen ve/veya rehabilite edilen tesisleri teknik, çevresel ve sosyal standartlara uygun olarak işletecek ve bakımını yapacaktır. - KASKİ, İLBANK tarafından hazırlanan Yeniden Yerleşim Planını uygulayacaktır. Kamulaştırma Kanunu kapsamında karşılanamayan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ÇSS5 tarafından zorunlu kılınan harcamalar KASKİ tarafından sosyal yardım fonundan karşılanmalıdır. - Alt proje inşaat faaliyetleri sırasında ortaya çıkan tesadüfi buluntularla ilgili tüm yazışmalardan KASKİ sorumlu olacaktır.
Denetim Danışmanı	- Denetim Danışmanı, proje kapsamında kontrolör olarak görev yapacak ve sözleşme paketlerinin hem çevresel ve sosyal hem de idari olmak üzere teknik ilerlemesini ve önlemlerin uygulanmasını kontrol edecektir. - Denetim Danışmanı, proje faaliyetlerini izlemek ve denetlemek için günlük olarak sahada bulunacaktır. - Denetim Danışmanı, alt projelerin ilerleyişi ve belirlenen Ç&S standartlarına uygunluğu hakkında düzenli raporlama yapmakla görevlendirilmiştir. Bu,

Roller	Sorumluluklar
	• verilerin toplanmasını, bulguların belgelenmesini ve bu raporların sunulmasının koordine edilmesini içerir. • Saha denetim bulgularını birleştirir ve yüklenicinin Ç&S ekibi tarafından sunulan raporları gözden geçirirler. • Denetim Danışmanı, gerekli raporları birleştirip inceledikten sonra KASKİ ve İLBANK Proje Uygulama Birimine (PUB) sunar. • Üç Aylık Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) İzleme Raporları hazırlarlar. Bu raporlar, İLBANK PUB tarafından nihai hale getirilmeden ve Dünya Bankası'na sunulmadan önce yerel PMC tarafından gözden geçirilir. • Denetim Danışmanı, tüm inşaat ve işletme faaliyetlerinin projenin çevresel ve sosyal standartlarına uygun olmasını sağlar ve uygunlukla ilgili ortaya çıkan sorunları ele alır. • Saha denetimleri sırasında ve raporlar dahilinde gözlemlenen herhangi bir uygunsuzluk durumunda uygunsuzluk formlarının hazırlanması Denetim Danışmanının sorumluluğundadır. Şantiye Sorumlusu, yaşam kaybı veya uzuv kaybı içeren veya 3 veya daha fazla gün hastanede bakım gerektiren ciddi bir olay meydana geldiğinde 24 saat içinde İLBANK'ı bilgilendirecektir.
İLBANK Genel Müdürlüğü	• İLBANK, projenin yönetimi ve uygulanmasından sorumlu olacak olan Uluslararası İlişkiler Departmanı altında PUB olarak hareket edecektir • İLBANK, alt projelerin tüm uygulama sürecini denetleyecek ve tüm proje faaliyetlerinin Dünya Bankası'nın çevresel ve sosyal standartlarına uygun olmasını sağlayacaktır • İLBANK, projenin Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planına (ÇSKP) uygunluğunu izleyecek ve projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) ve İLBANK'ın diğer ilgili belgelerine uygun olarak uygulanmasını sağlayacaktır. • İLBANK, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Yeniden Yerleşim Planı ve Paydaş Yönetim Planı gibi gerekli çevresel ve sosyal belgeleri hazırlayacaktır. • İLBANK, proje için bir Şikayet Mekanizmasının kurulmasını ve projenin yaşam döngüsü boyunca etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. • İLBANK, çevresel ve sosyal performans da dahil olmak üzere alt projenin tatmin edici bir şekilde uygulanmasından sorumludur. • İLBANK, inşaat yüklenicisinin, KASKİ Proje Ekibinin ve Kontrollük Müşavirinin ÇSG uyumluluğu ile ilgili performanslarını izleyecektir. • İLBANK, inşaat aşamasında yüklenicilerin üç aylık raporlarını inceleyecektir. İLBANK, projenin ÇSG performansı hakkında düzenli altı aylık izleme raporları sunarak Dünya Bankası'nı bilgilendirecektir. • İLBANK, alt projenin uygulanmasına ilişkin çevresel, sosyal ve teknik konular hakkında KASKİ ile irtibat halinde olacak ve KASKİ'nin sürece katılmasını ve projeyi sahiplenmesini sağlayacaktır. • Yüklenicinin çalışmalarıyla ilgili herhangi bir çevresel ve sosyal uygunsuzluk olması durumunda, İLBANK PUB 'Yükleniciye' bu uygunsuzlukları düzeltmesi talimatını verecektir. Yüklenicilerin önlemlerinin yeterliliği İLBANK PUB tarafından değerlendirilecektir. • İLBANK PIU, bu tür olayları Dünya Bankası'na (DB) bildirmekten sorumlu olacaktır.

4. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI MATRİSİ

Aşağıdaki tablo, alt proje faaliyetleri sırasında Yüklenici, Denetim Danışmanı ve İLBANK'ın uyması gereken gerekli önlemleri özetleyen Çevresel ve Sosyal Yönetim Planını (ÇSYP) temsil etmektedir.

Bu plan, alt projeye özgü beklenen çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri, önerilen etki azaltma önlemleriyle birlikte kapsar. Bu risklerin/etkilerin ortaya çıkmasının beklendiği aşamaları, izleme sistemindeki göstergeleri, sıklığı ve sorumlulukları detaylandırır. Yüklenici, hafifletici önlemlerin uygulanmasının maliyetini tekliflerine dahil edecektir. İLBANK, proje yönetimi bileşeninden kendi sorumluluğunda olan önlemler için yeterli bütçeyi ayıracaktır. Bu ÇSYP, proje zaman çizelgesi boyunca bu riskleri/etkileri ele almak için stratejileri kapsamlı bir şekilde tanımlamaktadır.

Yüklenici, Tablo 3'te belirtilen önlemleri nasıl uygulayacağını göstermek için kendi ÇSYP'sini (C-ÇSYP) hazırlayacaktır. Bu C-ÇSYP, denetim danışmanı tarafından gözden geçirilecek ve gerekli tüm revizyonlar yapıldıktan sonra İLBANK tarafından onaylanacaktır. Yüklenici, alt proje faaliyetleri ile ilgili Ç&S konularını yönetmek ve izlemek için etkili bir sistem kuracak ve bu sistem C-ÇSYP'ye de dahil edilecektir. Önlemlerin uygulanmasının etkinliği, Yüklenicinin organizasyon yapısı ve Yüklenici tarafından uygulanacak izleme planı denetim danışmanı tarafından izlenecektir.

Tablo 3'te belirtilen tüm uygulayıcı taraflar kendi öz izleme süreçlerini yürüteceklerdir. Buna ek olarak, denetim danışmanı yüklenici tarafından uygulanan faaliyetleri denetleyecek ve İLBANK yüklenici ve denetim danışmanının faaliyetlerini izleyecektir.

Tablo 2. Planlama, İnşaat ve İşletme Aşamaları için Çevresel ve Sosyal Etki Yönetim Planı

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹	
		Planlama	İnşaat	Operasyon		Sürekli	Aylık	Üç Aylık			
GENEL											
Çevresel ve sosyal yönetim	C-ÇSYP Yüklenici tarafından hazırlanacak ve danışman kontrolünden sonra onay için İLBANK PUB'a sunulacak ve daha sonra Alt Yükleniciler tarafından uygulanacaktır. İ-ÇSYP, inşaat işleri başlamadan önce sunulacak ve İ-ÇSYP onaylanana kadar alt proje kapsamında hiçbir inşaat faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir. C-E SMP, alt projeyle ilgili olarak aşağıdaki sahaya özgü alt yönetim planlarını içerecektir: - Hava Kalitesi Yönetim Planı (Toz Kontrol Yönetim Planı) - Gürültü Yönetim Planı	X	X		C-ÇSYP inşaat öncesinde onaylanacak ve inşaat dönemi boyunca uygulanacaktır.	X			Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim)		

¹ Maliyetler bu aşamada tam olarak belirlenmemektedir. Bunlar, faaliyete özel ÇSYP'lerde her bir faaliyet için hesaplanacaktır.

		Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Planlama	İnşaat	Operasyon		Süreklili	Aylık	Üç Aylık		
	- Atık Yönetim Planı - Su Kaynakları Yönetim Planı - Toprak Kirliliği Yönetim Planı - Trafik ve Güvenlik Yönetim Planı - Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Planı - İşgücü yönetim planı (proje İYG'sine uygun olarak hazırlanacaktır) - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı - Paydaş Katılımı Yönetim Planı ve Şikayet Mekanizması								PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama) KASKİ (gerektiğinde PUB'u destekler)	
Çevresel ve Sosyal Performansın Raporlanması	- Alt projelerin ÇSG performansı sorumlu yüklenicinin Ç&S ekibi tarafından günlük olarak izlenecek ve ekip saha bulgularını aylık olarak gözden geçirilmek üzere denetim danışmanına raporlayacaktır. - Denetim Danışmanı, saha inceleme bulgularını kontrol edip ekleyecek ve konsolide aylık izleme raporlarını İLBANK PUB'a sunacaktır. - Bu raporlar, Raporun kapsadığı dönemi takip eden ayın ilk haftası içinde İLBANK'a sunulmak üzere Denetim Müşavirine gönderilecektir. - İLBANK, altı aylık ilerleme raporlarının bir eki olarak DB'ye Aylık Çevresel ve Sosyal İzleme Raporları (ÇSMR) sunacaktır.		X		Görsel inceleme Şikayet kayıtları Uyumsuzluk Sayısı		X		Yüklenici Gözetim Danışmanı PIU	
İzin Verme	- Gerekli tüm izinler/rızalar/onaylar (inşaat izinleri dahil) ulusal mevzuata uygun olarak alınacaktır (örn. çevre izinleri ve lisansları). - Kazı çalışmalarına başlamadan önce ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinler alınacak ve Elbistan kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin bulunduğu 1. Etap alanlarında mevcut altyapıya (telefon, elektrik ve içme suyu vb.) zarar vermemek için altyapı güzergâhları belirlenecektir. - Alt proje bileşenleri, sismik faaliyetlere karşı koruma için Türk yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak tasarlanacak, inşa edilecek ve işletilecektir. Tüm inşaat işleri sırasında Bina Deprem Yönetmeliğine (R.G. tarih/no: 18.03.2018/30364) uyulacaktır. - Trafik Yönetim Planı çerçevesinde, kazı çalışmaları için alınacak yol kapatma ve alternatif ulaşım güzergâhları için ilgili kurumlardan izinler alınacak ve ardından inşaat çalışmalarına başlanacaktır.	X	X		Alınan tüm izinlerin kayıtları	X			Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (süpervizyon) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama) KASKİ (gerektiğinde PUB'u destekler)	

		Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Planlama	İnşaat	Operasyon		Süreklili	Aylık	Üç Aylık		
	İnşaat çalışmaları başlamadan önce yol kapatma izinlerinin alındığı sokaklarda, orada yaşayan yerel halk Sosyal Uzman tarafından yolun kapatılması ve çalışma planının detayları hakkında bilgilendirilecektir.									
Dökülmeler/ka zalar ve kirlenmiş arazi	- Kimyasalların, tehlikeli maddelerin ve diğer potansiyel kirleticilerin depolanması, kaza ve acil durum olaylarından kaynaklanan salınımların potansiyel saha içi ve saha dışı sonuçlarını azaltmak veya ortadan kaldırmak için envanter yönetimi yoluyla mümkün olduğunca minimumda tutulacaktır. - Toplam hacmi 1.000 L'ye eşit veya daha büyük olan varilli tehlikeli maddeler, toplam depolama hacminin en az %25'ini içerecek şekilde eğimli veya banketli geçirimsiz zemine sahip alanlarda depolanacaktır. Mobil ekipmana yakıt doldurmak için damlama tepsileri kullanılacaktır. - Toplam depolama hacmi 1.000 L'ye eşit veya daha büyük olan yer üstü tanklarına sahip tank çiftliklerinde, en büyük tankın en az yüzde 110'unu veya birleşik tank hacimlerinin yüzde 25'ini içerecek şekilde banketler, hendekler veya duvarlardan oluşan uygun ikincil muhafaza yapıları sağlanacaktır. İkincil muhafaza geçirimsiz, kimyasal olarak dayanıklı malzemeden yapılacaktır. - Yakıt ve sıvıların taşınmasından kaynaklanan herhangi bir dökülme derhal sahada kontrol altına alınacak ve kirlenmiş toprak uygun arıtma ve bertaraf için sahadan uzaklaştırılacaktır. - Yakıt ve kimyasal sıvıların dökülmesinden kaynaklanan kirliliğe sahada bulunan dökülme kitleri ile anında müdahale edilecek, kirliliğin ve sızıntının zemine yayılması önlenecektir. - Bağlantı noktalarında veya diğer olası taşma noktalarında tehlikeli madde konteynerleri için ikincil muhafaza, damlama tepsileri veya diğer taşma ve damlama muhafaza önlemleri sağlanacaktır. - Yüklenici tarafından sahada kullanılacak tüm mobil jeneratörler için ikincil muhafaza, damlama tepsileri veya diğer taşma ve damlama muhafaza önlemleri de sağlanacaktır.	X			Görsel inceleme Olay kayıtları ve kirlenmiş toprağın bertarafı Sahadaki Dökülme Kitlerinin miktarı ve sayısı		X		Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	
Üst toprağın ve toprak erozyonunun korunması	- Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi güzergahında kazı ve inşaat faaliyetleri başlamadan önce, yüzey toprağı veya üst toprak (bitki örtüsü, verimli toprak tabakası) ve güzergah boyunca toprak sıyırma işlemi yapılacaktır. - Toprak sıyırma sırasında üst toprak ve alt toprak karıştırılmayacak ve ayrı depolama için gerekli önlemler alınacaktır.		X		Görsel inceleme Olay kayıtları		X		Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim)	

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
		Planlama	İnşaat	Operasyon		Süreklili	Aylık	Üç Aylık		
	- Stok sahaları erozyon ve kirlenme etkilerinden korunacaktır. Üst toprak ve alt toprak ayrı ayrı depolanacak ve rehabilitasyon/bitkilendirme yoluyla uzun vadede olası erozyon ve sedimentasyon önlenecektir. - Kirlenmiş topraklar (eğer oluşmuşsa) uygun şekilde lisanslandırılmış bir bertaraf sahasında bertaraf edilecektir. - Maruz kalan alanlarda veya bu alanların yakınında çimento ve ıslak beton kullanımı dikkatle kontrol edilecektir. - Toprak işlerinden çıkan ve "kabul edilebilir dolgu" olarak sınıflandırılan enkaz ve diğer kazı fazlası malzeme, mümkün olan her yerde geri kazanılacak ve inşaat işlerinde kullanılacaktır. Malzemenin yeniden kullanımının kabul edilebilir olduğundan emin olmak için ilgili makamlara saha bazında danışılacaktır. - İhtiyaç fazlası inşaat malzemesi, sahada kullanılamaması halinde yerel kalkınma projelerinde yeniden kullanılmak üzere üçüncü tarafların kullanımına sunulacaktır. - İnşaat faaliyetleri sonucunda erozyonun hızlanmasını ve/veya artmasını önlemek için erozyon koruma ve stabilizasyon önlemleri sağlanacaktır. - İnşaat faaliyetleri sırasında, tehlikeli ve tehlikeli olmayan malzemeler ve atıklar sahaya özgü Atık Yönetim Planına uygun olarak ele alınacaktır. - Yeraltı, yüzey ve atık suları sahadan uzaklaştıracak uygun drenaj sistemleri oluşturulacaktır. - İnşaat sahalarında toprak erozyonunu önlemek için eğimlerin uzunluğu ve dikliği konturlanacak ve en aza indirilecektir. - Özellikle Söğütlü Çayı boyunca projelendirilen kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke çalışmalarında drenaj sistemlerinin yüksek yeraltı su seviyesi nedeniyle erozyona ve sedimentasyona neden olmadan inşa edilmesi sağlanmalıdır. - Kazı çukurunda biriken yeraltı suyunun drenajı yapılırken debiye bağlı olarak erozyonu önlemek için saman balyaları ve debi azaltıcı drenaj tankları vb. sistemler kullanılacaktır. Yüklenici, kullanacağı drenaj yöntemini uygulamadan önce İLBANK PUB ve danışmandan onay aldıktan sonra çalışmalara başlayacaktır. - İnşaat sahalarında toprak erozyonunu önlemek için yamaçların uzunluğu ve dikliği konturlanacak ve en aza indirilecektir. - Özellikle Söğütlü Çayı yakınlarında yapılacak kazı çalışmaları sırasında sahada toprak depolanmasına izin verilmeyecektir.								PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	

		Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Planlama	İnşaat	Operasyon		Süreklili	Aylık	Üç Aylık		
Yüzey sularının korunması	- Su kirliliği risklerini en aza indirmek için iyi şantiye uygulamaları (yani malzemelerin depolanması için belirlenmiş alanların kullanılması, şantiyelerde düzenli denetimler, inşaat işçilerinin eğitimi, tortu tutucuların ve/veya yağ/su vb. tesislerin kurulması gibi aşağıda açıklanan önlemler) benimsenecektir. - Toprak stokları, çalışma alanının dışında belirlenmiş alanlarda gerektiği şekilde depolanacak ve kazı malzemelerinin ve dolgu malzemelerinin (örn. dış kaynaklardan) kalitesi kontrol edilecektir. Sediman taşınmasını ve kaçak toz emisyonlarını önlemek için toprak ve üstü yapı stok sahalarında önlemler alınacaktır. - Yüzey sularına doğrudan deşarjı önlemek için yüzey akışı ve saha drenajı yönetilecektir. Özellikle Söğütlü Çayı'na doğrudan deşarj yapılmayacak ve deşarj sırasında suyun kirlenmemesi ve nehirdeki canlı habitatlarının yaşam koşullarının bozulmaması için tüm önlemler alınacaktır. - Söğütlü Çayı'na deşarj edilmeden önce hendek içerisindeki su dinlendirilecek ve berrak su olarak deşarj edilecektir. Deşarj edilecek suyun debisini azaltmak için deşarj çıkışında saman balyaları, debi azaltıcı deşarj tankları veya izolasyonlu deşarj çukurları açılacak ve bu sistemler kullanılarak deşarj işlemi başlatılacaktır. - Yüklenici, kurulacak deşarj sistemlerinin çalışma yöntemlerini gösteren kayıtları ve açıklamaları İLBANK PUB'a ve danışmana sunacak ve onay alındıktan sonra ilgili sistemler kurulacaktır. - Kirlenmiş yüzey akışı çevreye deşarj edilmeden önce arıtmaya gönderilecektir. - Kamp alanlarından evsel atık suların toplanması için yerinde geçirimsiz (yani polietilen) septik tanklar kullanılacak ve atık suların çevreye doğrudan deşarjını önlemek için atık suların vidanjörlerle toplanması ve bertaraf edilmesi için belediye ile gerekli anlaşmalar yapılacaktır. - Proje su ihtiyacı için herhangi bir yüzey suyu çekimi yapılmayacaktır. İnşaat faaliyetleri ve toz bastırma için su ihtiyacı mevcut belediye hattından sağlanacaktır. - Elbistan kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinin projelendirildiği güzergâha denk gelen Söğütlü Çayı'na inşaat faaliyetleri sırasında müdahale edilmeyecek, yönü ve nehir yatağı değiştirilmeyecektir. İnşaat çalışmaları başlamadan önce bağımsız akredite bir firma tarafından nehirde numuneler alınacak ve su analizleri yapılacaktır. İnşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra nehirde tekrar su numuneleri alınacak ve çalışmaların kirlilik üzerindeki etkisi karşılaştırılacaktır. Proje çalışanlarına verilecek eğitimler ile Söğütlü Çayı'na yaklaşmak ve girmek yasaklanacak.		X		Görsel inceleme Su analiz sonuçları Onaylı deşarj sistemlerinin çalışma yöntemlerine ilişkin kayıtlar Olay kayıtları		X		Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	

		Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Planlama	İnşaat	Operasyon		Süreklili	Aylık	Üç Aylık		
	İnşaat işlerinde kullanılacak makine ve ekipmanların yağ ve yakıt sistemleri düzenli olarak kontrol edilecek ve herhangi bir yağ ve yakıt sızıntısını önleyecek tedbirler alındıktan sonra çalıştırılacaktır.									
Yeraltı sularının korunması	- İnşaat faaliyetleri sahada düzenli olarak denetlenecektir. - İnşaat işçileri ve ilgili personel, iyi şantiye uygulamaları ve dökülmeye müdahale ve önleme tedbirlerinin uygulanması konusunda eğitilecektir. - Proje çalışanları dökülme müdahale kitlerinin kullanımı ve tatbikatlar konusunda eğitilecektir. - Kazı yapılan alanlarda ve Söğütlü Çayı yakınlarında araç veya ekipmana yakıt ikmali yapılmayacaktır. Yakıt ikmali yalnızca saha dışına deşarj olan yüzey drenaj yollarından uzakta belirlenmiş alanlarda yapılacaktır. - Kazı alanlarında hiçbir tehlikeli madde depolanmayacak ve tehlikeli maddelerle ilgili tüm işlemler özel gözetim altında gerçekleştirilecektir. - Depolama alanları, sahada depolanan tehlikeli maddeler ve atıklar için ikincil koruma sağlayacak şekilde tasarlanacak ve inşa edilecektir. - Dökülme durumunda yeraltı sularının kirlenmesini önlemek için sıvı malzemelerin depolandığı alanlarda dökülme kitleri bulundurulacak ve bu malzemelerin depolandığı alanların drenaj sistemleri dökülme ve sızıntıların yağmur suyu sistemine ulaşmasını önleyecek şekilde tasarlanacaktır.		X		Görsel inceleme Eğitim Kayıtları Olay kayıtları		X		Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	
MALZEME KAYNAKLARI VE ATIK YÖNETİMİ										
Malzeme Temini	- Nakliye yollarının ve mesafenin etkisini en aza indirmek için malzemeler Proje sahasına mümkün olduğunca yakın bir yerden temin edilecektir. Mümkün olan yerlerde, yerel faydaları en üst düzeye çıkarmak için malzeme ve hizmet tedarikinde yerel tedarikçilere öncelik verilecektir. - Taş ocakları, ariyet ocakları, kırma tesisleri, beton santralleri ve asfalt tesislerinden gelen malzemeler, geçerli çevre ve diğer izin ve lisanslara sahip olan ve sahaların yürürlükteki tüm çevre, sağlık ve güvenlik ve sosyal standartlara ve şartnamelere tam uyum içinde yönetildiği tedarikçilerden temin edilecektir. - Bu malzemelerin/kimyasalların uygun depolama koşulları, ilgili kimyasal ve sağlık ve güvenlik yönetmelikleri ve uluslararası kılavuzlar doğrultusunda belirlenecektir. - Malzeme güvenlik sertifikası olmayan kimyasal malzemeler proje sahasında bulundurulmayacak ve depolanmayacaktır.								Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
		Planlama	İnşaat	Operasyon		Süreklili	Aylık	Üç Aylık		
Hafriyat Malzemesi Yönetimi	- İnşaat alanlarından sıyrılan üst toprak ve hafriyat malzemesi, Elbistan Belediyesi/KASKİ tarafından belirlenen geçici Hafriyat Malzemesi Depolama Alanlarında ayrı ayrı depolanacaktır. - Üst toprak, depolama sırasında etki azaltıcı önlemlerle korunacak ve son olarak peyzaj için kullanılacaktır. - Uygun olması halinde, kazılan malzeme proje sahasında dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır. - Hafriyat malzemeleri sahada biriktirilmeyecek ve Elbistan Belediyesi/KASKİ tarafından izin verilen hafriyat depolama alanına taşınacaktır. - Hafriyat atıkları, Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak yönetilecektir.		X		Görsel inceleme Bertaraf miktarı ve alanı kayıtları	X			Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	
Atık Yönetimi	- İnşaat aşaması için Türk Mevzuatı ve DBG ÇSY hükümleri doğrultusunda sahaya özel bir Atık Yönetim Planı (AYP) hazırlanacaktır. - Mümkün olan her yerde, hammadde gerisi kazanımı ve yeniden kullanımı yoluyla atık miktarının ve hammadde kullanımının en aza indirilmesine öncelik verilecek ve atıklar atık yönetimi hiyerarşisine uygun olarak yönetilecektir. - Tüm atıklar, atık minimizasyonu, ayrıştırma, etiketleme, depolama, taşıma ve geri dönüşüm/bertaraf konularını ele alan ilgili Türk yönetmeliklerinin gerekliliklerine uygun olarak toplanacak, ayrıştırılacak, etiketlenecek ve sahada geçici olarak depolanacaktır. - Özelliklerine göre sınıflandırılan ve geçici depolanan atıkların üzerinde tehlikeli veya tehlikesiz etiketi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve depolama tarihi belirtilecek/etiketlenecektir. Geçici Depolama Alanında alınan önlemler ile atıkların birbirleri ile reaksiyona girmesi engellenecektir. - Belediye ve ambalaj atıkları dışındaki atıkların (örneğin tehlikeli ve diğer özel atıklar) Geçici Atık Depolama Alanında depolanması için ilgili makamdan izin alınacaktır - Dökülmeler, inşaat çalışmalarından önce hazırlanacak uygun Atık Yönetim Planına uygun olarak derhal ele alınmalı ve gerekirse toprağın temizlenmesi ve kaldırılması ve bertaraf edilmesi başlatılmalıdır. - Atıklar nihai bertaraftan önce atık türüne uygun kapalı konteynerlerde toplanacak ve sahada kurulacak Geçici Atık Depolama Alanında depolanacaktır. - Atıkların geri dönüşümü, taşınması ve bertarafı lisanslı şirketler ve/veya ilgili belediyeler aracılığıyla gerçekleştirilecektir.	X	X		Kontrol önlemlerinin görsel denetimi Atık üretim ve bertaraf kayıtları Eğitim kayıtları Şikayet kayıtları		X		Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	

		Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Planlama	İnşaat	Operasyon		Süreklili	Aylık	Üç Aylık		
	- Çalışma alanında, özellikle Söğütlü Çayı yakınlarında yakıt ikmaline izin verilmeyecektir. - Yakıt ikmal ve diğer toksik sıvıların transferi için yerleşim alanından uzakta (ve drenaj yapılarından en az 50 m ve önemli su kütlelerinden 100 m uzakta) güvenli bir alan; ideal olarak sert/gözeneksiz bir yüzey kullanılacaktır. - Çalışma sahasında makine ve ekipman bakımı yapılmayacaktır. Yağlı bezler, yağ filtreleri, kullanılmış yağ vb. gibi küçük miktarlardaki bakım malzemeleri sızdırmaz kontamine atık kutularında toplanacak ve iş bitiminde geçici atık depolama alanının tehlikeli atık bölümünde biriktirilerek uygun şekilde bertaraf edilecektir. Kullanılmış yağ, toprağı ve yeraltı sularını (içme suyu akiferleri dahil) kirletebileceğinden asla yere ve su yollarına dökülmeyecektir. - Tüm atık üretimi, saha içi depolama ve üçüncü taraf atık yönetim tesislerine saha dışı atık taşıma faaliyetleri için kayıtlar tutulacaktır. - Kazı çalışmalarından çıkarılan hafriyat malzemeleri Elbistan Belediyesi tarafından izin verilen hafriyat depolama alanına taşınacaktır. - Tüm çalışanlar Atık Yönetim Planı konusunda eğitilecektir. Asbest boruları ve tehlikeleri de bu eğitimde açıklanacaktır. - Alt Proje çalışma alanındaki kazılar sırasında asbest içeren borulara rastlanırsa, yüklenici o alandaki çalışmaları durduracak ve bir Asbest Yönetim Planı hazırlayacak ve Danışman ve İLBANK PUB'nin onayı olmadan o alandaki çalışmalara devam etmeyecektir.									
Su ihtiyacı ve atık su üretimi	- İnşaat çalışmaları öncesinde Su Kaynakları Yönetim Planı hazırlanacak ve uygulanacaktır. - Personelin içme suyu konusunda İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe (R.G. tarih/no: 17 Şubat 2005/25730) uyulacaktır. - Faaliyetler, içme ve hijyenik amaçlı su mevcudiyetini etkilemeyecektir. - Kirlenmiş malzemeler, katı atıklar, zehirli veya tehlikeli maddeler seyreltme veya bertaraf amacıyla su kaynaklarında depolanmayacak, dökülmeyecek veya bertaraf edilmeyecektir. - Projenin inşaat aşamasında oluşacak evsel atık sular için sızdırmaz septik tanklar inşa edilmeli ve burada toplanan atık sular vidanjörlerle Elbistan Belediyesi'nin atık su arıtma tesisine taşınmalıdır. - Dere yataklarının kurumasına veya yerleşim yerlerinin sular altında kalmasına neden olabilecek şekilde doğal suların akışı engellenmemeli veya yönü değiştirilmemelidir. Özellikle Söğütlü Çayı yakınlarında yapılacak kazı çalışmalarında suyun akışına müdahale edilmemeli, yönü değiştirilmemelidir.	X			Kontrol önlemlerinin görsel denetimi Septik tank atık su bertaraf kayıtları (varsa) Atık su kalitesi ölçüm kayıtları (varsa) Şikayet kayıtları	X			Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	

		Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Planlama	İnşaat	Operasyon		Süreklili	Aylık	Üç Aylık		
Cinsel Sömürü ve İstismar (SEA)/Cinsel Taciz (SH)	- Mümkün ve uygulanabilir olduğu durumlarda, yerel istihdam seçenekleri Projenin tüm aşamalarında dikkate alınacaktır. - Kültürel farklılıkların etkisini en aza indirmek için tüm proje personeli işe başlarken Davranış Kuralları konusunda eğitilecektir. - Proje personeli SEA/SH ve CoC konusunda eğitilecek ve cinsel istismara karışanların iş sözleşmeleri feshedilecektir. - Proje çalışanlarının CoC'yi imzalaması zorunlu olacaktır. - Kadınların (veya mağdurların) GM/WGM'ye güvenli bir şekilde erişebilmelerini sağlamak için Proje şikayet mekanizması (GM) ve çalışanların şikayet mekanizması (WGM) içinde şikayetlerin güvenli ve gizli bir şekilde kaydedilebileceği birden fazla kanalın etkinleştirilmesi. - Kadınların cinsel istismar şikayetleri gizli bir şekilde ele alınacak ve bu şikayetlerin paylaşılmasını sağlamak için şikayet mekanizması içinde kadın personel (örneğin Kadın Sosyal Hizmet Uzmanları) istihdam edilecektir. - Kadınların cinsel istismar şikayetleri gizli bir şekilde ele alınacak ve bu şikayetlerin paylaşılmasını sağlamak için şikayet mekanizması içinde kadın çalışanlar (örneğin Kadın Sosyal Uzmanlar) istihdam edilecektir. - Proje çalışanlarına verilecek Ç&S eğitimlerinin içeriğinde Cinsel Sömürü ve Cinsel Taciz de yer alacaktır.		X		SÇD/SH ve CoC ile ilgili eğitim kurslarının sayısı CoC'yi imzalayan çalışan sayısı. SEA/SH şikayetlerini almak için GM/WGM'deki kanalların başarılı bir şekilde entegre edilmesi. SÇD/SH şikayetlerinin sayısı		X		Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (PUB düzeyinde uygulama ve yüklenici tarafından uyumun izlenmesi ve raporlama)	
HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ										
İnşaat sırasında toz emisyonları	- İnşaat sırasında toz emisyonlarını azaltmaya yönelik hafifletici önlemleri içerecek bir Toz Kontrol Yönetim Planı hazırlanacaktır. - İnşaat faaliyetlerinden kaynaklanan minimum partikül emisyonları, iyi yönetim ve temizlik uygulamaları ve toz bastırma yöntemlerinin kullanımı ile sağlanacaktır. Proje sahası içindeki toz üreten alanlarda, özellikle kuru hava koşullarında su püskürtme işlemi yapılacaktır. - İç yollar tozlanmayı önleyecek malzemelerle kaplanacak ve bu yollar temiz tutulacaktır. - Hafriyat toprağı Elbistan Belediyesi tarafından belirlenen alanlarda stoklanacak ve yerleşim yerlerinden mümkün olduğunca uzağa yerleştirilecektir. - Saha temizleme artıklarının (ağaçlar, çalılar) veya inşaat atık malzemelerinin yakılması yasaklanacaktır.		X		Hava kalitesi kontrol önlemlerinin görsel denetimi Bakım kayıtları Şikayet kayıtları	X			Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	

		Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Planlama	İnşaat	Operasyon		Süreklili	Aylık	Üç Aylık		
	İnşaat sırasında malzemelerin taşınmasından kaynaklanan toz emisyonlarını en aza indirmek için aşağıdaki etki azaltma önlemleri uygulanacaktır: - Trafik Yönetim Planında belirtilen hız sınırlarına uyulacak ve araç sürücüleri toz kontrolü konusunda eğitilecektir. - Özellikle kuru hava koşullarında önemli toz emisyonlarını önlemek için transfer yollarına gerektiğinde su püskürtülecektir (örneğin mobil su kamyonu kullanılarak). - Hafriyat toprağı taşıyan üstü açık kamyonlar inşaat alanından ayrılmadan önce kapatılacaktır. - Sık kullanılan ve uzun mesafeli yollar toz oluşumunu önlemek için asfaltlanacaktır (örn. asfalt, beton, vb.). - Toz emisyonu kaynaklarını belirlemek için stok sahalarında, taşıma yollarında ve ağır araç hareketleri sırasında günlük görsel denetimler yapılacaktır. - Toz Kontrolü Yönetim Planı kapsamında ve alınan şikayetlere bağlı olarak gerektiğinde PM10 ölçümleri yapılacak ve sonuçlara göre etki azaltıcı önlemler uygulanacaktır. - Elbistan'da yerel halk ve muhtarlarla istişare toplantıları yapılacak ve yoğun toz sorunu yaşanan bölgelerde ek sulama tedbirleri alınacak. - Şikayet mekanizması üzerinden gelen şikayetlerin bölgesel olarak yoğun olduğu bölgelerde toz oluşumunu engellemek için ek önlemler alınacak veya çalışma ekiplerinin sayısı azaltılarak ekiplerin çalışma alanına homojen bir şekilde dağılması sağlanacaktır.				Hafriyat atığı depolama alanı izinleri					
İnşaat sırasında egzoz emisyonları	- Kötü performanstan kaynaklanan egzoz emisyonlarını en aza indirmek için iş makinelerinin ve kamyonların düzenli olarak bakımları yapılacak ve iyi çalışır durumda tutulmaları sağlanacaktır. - Egzoz emisyonu sorunlarına neden olan düşük performanslı araçlar ve ekipmanlar yenileriyle değiştirilecektir. - Ekipmanların/kamyonların motorlarının rölantide ve gereksiz yere çalışması önleneyecektir. - Malzeme taşımacılığının uygun şekilde planlanmasıyla Proje tarafı içinde ve dışında gereksiz Proje trafiği önleneyecektir. - İnşaat trafiğinin etkilerini azaltacak bir İnşaat Trafik Yönetim Planı hazırlanacak ve uygulanacaktır.		X		Hava kalitesi kontrol önlemlerinin görsel denetimi Bakım kayıtları Şikayet kayıtları		X		Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
		Planlama	İnşaat	Operasyon		Süreklili	Aylık	Üç Aylık		
	- İş ekipmanlarının egzoz emisyonlarının periyodik kontrolleri düzenli olarak yapılacak ve olumsuz raporlu araç ve ekipmanlar projede kullanılmayacaktır. - Proje çalışanları hava kalitesi etkileri ve etki azaltma önlemleri konusunda eğitilecektir. Özellikle toz ve emisyonu neden olacak malzemeleri taşıyan nakliye kamyonları, inşaat sahasına girip çıkarken ve kamuya açık yollarda brandalarla örtülecektir. Başta kamyonlar olmak üzere Proje kapsamında kullanılan tüm araçlara hız sınırları uygulanacaktır.									
GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ										
Gürültü	İnşaat işleri başlamadan önce bir Gürültü Yönetim Planı hazırlanacak ve danışman kontrolünden sonra onay için İLBANK PUB'a sunulacaktır. Gürültü Yönetim Planı aşağıdaki etki azaltma önlemlerini içerecektir: - Arazi hazırlığı ve inşaat faaliyetleri sırasında kullanılacak makine ve ekipmanlar aynı noktada/yerde çalıştırılmayacak, saha içinde homojen olarak dağıtılacaktır. - İnşaat aşamasında mümkün olduğunca 'düşük gürültülü' ekipman kullanılacaktır. - Makineler çalışmadığı zamanlarda kapatılacak veya minimuma indirilecektir. - Ekipmanı iyi çalışır durumda tutmak ve düşük performanstan kaynaklanan yabancı gürültüyü en aza indirmek için bakım prosedürleri uygulanacaktır. - Alt proje kapsamında gece çalışmasına izin verilmeyecektir. - İnşaat trafiğiyle ilgili gürültü, Trafik Yönetim Planının uygulanması yoluyla uygun şekilde yönetilecektir. - Yakındaki topluluklarla iletişime geçilecek ve özellikle gürültülü faaliyetlerden önce çalışma planı hakkında bilgilendirilecektir. - İnşaat çalışanları arasında gürültünün azaltılması konusunda farkındalık artırılacaktır. - Uygun bir halkla ilişkiler programı geliştirilmeli ve yakın yerleşim yerlerindeki halk sosyal uzman tarafından bilgilendirilmelidir. - Yerel halkın herhangi bir hoşnutsuzluğunu önlemek amacıyla, yerel sakinlerin gürültü ve titreşimle ilgili şikayetlerini toplamak için etkili bir şikayet mekanizması kurulacaktır. - Şikayet mekanizması yoluyla gelen şikayetlerin yoğun olduğu bölgelerde gürültü ölçümleri yapılacak ve gürültü yönlendirme perdeleri vb. dahil olmak üzere gerekli azaltıcı önlemlerle gürültü seviyesi yasal değerlere indirilecektir.		X		Gürültü kontrol önlemlerinin görsel denetimi Şikayet kayıtları Gürültü ölçüm sonuçları (varsa)	X			Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	
TRAFİK YÖNETİMİ										

		Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Planlama	İnşaat	Operasyon		Süreklili	Aylık	Üç Aylık		
Proje Trafik	Projeye özel bir Trafik Yönetimi ve Güvenlik Planı hazırlanacak ve uygulanacaktır. - İnşaat Trafik Yönetimi ve Güvenlik Planının bir parçası olarak hafifletici önlemler, etkilenen topluluklar, topluluklardaki hassas kişiler veya gruplar ve paydaşlarla istişare edilerek geliştirilecektir. Uygun istişare önlemleri Planda sağlanacaktır. - Planın uygulanması ile ilgili olarak ilgili makamlarla gerekli istişareler yapılacaktır. - Yerel sakinlerden ve diğer paydaşlardan potansiyel trafik sorunlarına ilişkin şikayetlerin toplanması için etkili bir şikayet mekanizması uygulanacaktır. - Planlanan Alt Proje çalışmalarına başlamadan önce ilgili kurumlardan yol kapatma izinleri alınacak ve yerel halkın mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar belirlenecektir. - Araç ve yaya trafiğinin okullar ve sağlık merkezleri gibi kamu tesisleri üzerindeki etkisini en aza indirmek için bir Trafik Yönetim Planı uygulanacaktır. Yaya trafiğini sağlamak ve kazaları önlemek için kazı alanları güvenlik bariyerleri ile çevrelenecektir. - Özellikle, proje alanı içindeki yaya trafiğini yönetmek ve işyerleri ile yerleşim alanlarına erişimi önlemek için korkuluklu platformlar kullanılacaktır. - Projenin yaratacağı trafik yoğunluğunun işyerlerinin ticari faaliyetlerini engellememesini sağlayacak önlemler alınacaktır. - Çalışma alanlarına uygun ve yönlendirici trafik işaretleri ve işaretlemeleri yerleştirilecektir.		X		Trafik kazası kayıtları Şikayet kayıtları		X		Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	
BIYOLOJİK ÇEVRE YÖNETİMİ										
Flora ve Fauna Üzerindeki Etkisi	- İnşaat faaliyetleri belirlenen çalışma alanının dışına çıkmayacak ve çalışma alanı dışındaki toprak, bitki örtüsü ve ağaçlara zarar verilmeyecektir. - İş makineleri, ekipmanlar ve araçlar çalışma alanının dışına park edilmeyecek ve sürücüler ve operatörler eğitilecektir. - İnşaat sahaları ve erişim yolları, personelin ve araçların diğer alanlara erişimini sınırlandırmak için uygun tabelalar, işaretler ve çitlerle diğer alanlardan ayrılacaktır - Proje alanı çevresindeki su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için önlemler alınacak ve çalışanlar eğitilecektir. Atıkların su ortamlarına atılması ve/veya boşaltılması yasaklanacaktır. - Proje personeline verilen eğitim içeriğinde biyoçeşitlilik farkındalığı yaratılacak ve gerekli etki azaltma önlemleri hakkında bilgi verilecektir.		X		Ağaç dikim kayıtları Kontrol önlemlerinin görsel denetimi		X		Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
		Planlama	İnşaat	Operasyon		Sürekli	Aylık	Üç Aylık		
	Habitatların gereksiz yere tahrip edilmesi önlenecek ve proje alanı dışındaki ağaçlara veya bitki örtüsüne müdahale edilmeyecektir. - Çalışanlar, yükleniciler ve saha ziyaretçileri özellikle Söğütlü Çayı'ndaki balık ve su canlılarının üreme dönemleri hakkında bilgilendirilecek ve gerekli görülen durumlarda canlıların üreme dönemlerinde inşaat faaliyetleri yavaşlatılacaktır. - Üreme ve yumurtlama dönemlerinde yeraltı suyu deşarjı ve su kirliliği önlenecek ve gerekli tüm tedbirler alınacaktır. - Toz emisyonları, inşaat alanlarının yakın çevresinin hafifçe sulanması ve depolanan malzemenin ıslatılmasıyla en aza indirilecektir. - İnşaat faaliyetlerinden kaynaklanan inşaat atıkları çalışma alanında depolanmayacak, önceden belirlenmiş depolama alanlarında depolanacak ve daha sonra bertaraf edilecektir.									
İŞGÜCÜ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI										
İşgücü ve çalışma koşulları	Proje sırasında aşağıdakileri içeren bir İşgücü Yönetim Planı hazırlanacak ve uygulanacaktır: - Personel Seçme ve İstihdam Prosedürü; - İşçi Şikayet Mekanizması geliştirilecek ve uygulanacaktır: - tüm Proje çalışanlarına (yüklenicilerin çalışanları dahil) açık olacaktır; - çalışanlar tarafından kolayca erişilebilir olmalıdır; - cezadan muaf olmak; - isimsiz şikayetlerin dile getirilmesine ve ele alınmasına izin vermelidir; - Çalışanlar işe alım sırasında ve düzenli eğitimler yoluyla bu mekanizma hakkında bilgilendirilecektir - SEA/SH niteliğindeki şikayetleri ele alın - Yüklenici, Davranış Kuralları da dahil olmak üzere bir İşgücü Yönetimi Prosedürü oluşturacak ve uygulayacaktır. - İşe alımdan sonra, işçilere ulusal mevzuata uygun olarak istihdam şartlarını ve haklarını içeren sözleşmeler imzalatılacak ve bir kopyası işçilere verilecektir. - Çalışan Sözleşmeleri, eğitim kayıtları, imzalı Davranış Kuralları, yakın akrabalara ilişkin bilgiler ve tıbbi denetim raporları dahil olmak üzere veri dosyaları tutulacaktır. - Sözleşmede belirtilen maaş tutarı çalışanlara zamanında ve tam olarak ödenecektir.		X		Çalışan kayıtları Eğitim kayıtları Çalışan şikayetlerinin kayıtları		X		Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (PUB düzeyinde uygulama ve yüklenici tarafından uyumun izlenmesi ve raporlama)	

		Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Planlama	İnşaat	Operasyon		Sürekli	Aylık	Üç Aylık		
	- İş sözleşmesi olmayan kişi(ler) yüklenici ve alt yüklenici tarafından istihdam edilmeyecektir. - İşe alınan çalışanlar İSG ve bu ÇSYP kapsamındaki tüm eğitimleri aldıktan sonra çalışma alanına girecektir. Eğitimleri tamamlanmayan çalışanların çalışma sahasına girmesine izin verilmeyecektir. - Yerel istihdama öncelik verilecektir.									
İş sağlığı ve güvenliği	- Yürürlükteki ulusal sağlık ve güvenlik mevzuatı ve uluslararası standartlar doğrultusunda bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı hazırlanacak ve uygulanacaktır. - Toz emisyonları ve gürültü oluşumu, azaltıcı önlemlerin uygulanmasıyla mümkün olduğunca en aza indirilecek ve çalışanların toza ve gürültüye maruziyeti düzenli aralıklarla ölçülecektir. - İşçilerin ve halkın güvenliği için sahada çit kurulumu, uyarı ve yönlendirme işaretlerinin açık ve görünür bir şekilde yerleştirilmesi sağlanacaktır. - Her gün işe başlamadan önce çalışanlara (taşeronlar dahil) işe özel bir İSG araç kutusu konuşması yapılacak ve gerekli kişisel koruyucu ekipman sağlanacaktır. - Alt projede yer alan tüm işçilere KKD (baret, iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, eldiven vb.) sağlanacaktır. - Kişisel koruyucu ekipman temin edilmeyen ve/veya kullanmayan çalışanların çalışma sahasına girmesine izin verilmeyecektir. - Tüm çalışanlara (alt yükleniciler dahil) ilk işe alındıklarında çalışma sahasına gitmeden önce yasal olarak zorunlu olan işe başlama eğitimi verilecek ve eğitim almayan çalışanların işe başlamasına izin verilmeyecektir. - Yüksekte çalışma, ağır ekipman kullanımı ve benzeri yüksek riskli faaliyetler için çalışma izinleri gerekecektir; - Tüm çalışanlar (taşeronlar dahil) sağlık ve güvenlik konusunda eğitilecek ve olaylara zamanında müdahale etmek için bir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı hazırlanacaktır. - Acil durum hazırlık ve müdahale planı çerçevesinde müdahale ekipleri oluşturulacaktır. - Sağlık ve güvenlik uygulamalarının etkinliği iç ve dış denetimler yoluyla izlenecek ve gerektiğinde düzeltici önlemler alınacaktır.	X			- Görsel inceleme - Çalışan kayıtları - Ekipman kayıtları - Kontrol önlemlerinin görsel denetimi - İSG kayıtları. - Olay istatistikleri ve kayıtları	X			Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	

		Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı				
Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Planlama	İnşaat	Operasyon		Süreklili	Aylık	Üç Aylık	Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
	- Şantiye Şefi, İşveren (Belediye) ve İLBANK, can kaybı veya uzuv kaybı içeren veya 3 gün veya daha fazla hastane bakımı gerektiren ciddi olaylardan 24 saat içinde haberdar edilecektir. - Tüm kazalar ve olaylar Çevresel ve Sosyal Olaylara Müdahale Aracı (ESIRT) ve Ulusal yasa ve yönetmelikler (İş Sağlığı ve Güvenliği (No 6331) vb.) doğrultusunda kayıt altına alınacaktır. - Sağlık ve güvenlik uygulamalarının etkinliği iç ve dış denetimler yoluyla izlenecek ve gerektiğinde düzeltici önlemler alınacaktır. - Tedarik ağındaki alt yüklenicilerin ve birincil tedarikçilerin alt proje İSG plan ve prosedürlerine uygun olarak çalışması ve etki azaltıcı önlemlerin uygulanması sağlanacaktır.									
TOPLUM SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE EMNİYETİ										
Toplum sağlığı, güvenliği ve emniyeti	- Projenin inşaat aşaması için bir Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti Planı hazırlanacak ve uygulanacaktır. - Personel, toplum sağlığı ve güvenliği önlemlerinin ve davranış kurallarının önemi konusunda eğitilecektir. - Yerel topluluklarla teması en aza indirmek için Proje personeline yeterli kalitede konaklama ve kamp alanı hizmetleri sağlanacaktır. - Çalışma alanı civarındaki topluluklar, çalışmaların başlamasından önce istişare toplantıları, broşürler ve bilgilendirme tabelaları aracılığıyla bilgilendirilecektir. - Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde nakliye ve malzeme taşımacılığı trafik yoğunluğunun azaldığı saatlerde yapılacaktır. - Güvenli yaya erişimi için mümkün olan yerlerde inşaat alanlarında yaya geçidi ekipmanları kullanılacaktır. - Elbistan ilçe merkezindeki kutsal yapıların, türbelerin ve ibadethanelerin proje sırasında zarar görmemesi için ilgili tüm önlemler alınacaktır. Ekip üyeleri, yerel topluluklar için manevi değeri olan nesnelere zarar vermekten kaçınmak için çalışmalar başlamadan önce eğitilecek ve bilgilendirilecektir. - Çalışma planı, proje alanında bulunan işyerleri ve ticari kuruluşların ticari faaliyetlerini engellemeyecek şekilde yapılacaktır. Özellikle ticari faaliyetleri engelleyecek yol kapatmaları alternatif güzergâhlar belirlenip bilgilendirme yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.		X		Kontrol önlemlerinin görsel denetimi Trafik kazası kayıtları Şikayet kayıtları		X		Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	

		Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Planlama	İnşaat	Operasyon		Süreklili	Aylık	Üç Aylık		
	- İnşaat faaliyetleri okullar, hastaneler ve camiler gibi hassas alanların günlük işleyişini aksatmayacak şekilde yürütülecektir. - İnşaat alanları ve erişim yolları, personel ve araçların diğer alanlara erişimini sınırlamak için uygun tabelalar, işaretler ve çitlerle diğer alanlardan ayrılacaktır.									
	- Paydaş Katılım Planı (PKP) doğrultusunda topluluklar ve diğer paydaşlarla bilgi paylaşımı ve istişare faaliyetleri yürütülecektir. - Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı hazırlanacak ve uygulanacaktır. - Trafik Yönetim Planı geliştirilecek ve uygulanacaktır. - Toplumsal Proje'nin ömrü boyunca endişelerini dile getirebilmesi için bir şikayet mekanizması kurulacak ve şikayet mekanizmasının görünürlüğü sağlanacaktır. - Elbistan'ın yerel kültürü ve değerleri projenin tüm aşamalarında göz önünde bulundurulacak ve çalışanlar davranış kuralları konusunda eğitilecektir. - Kültür çatışmasına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınılacak ve çalışanlar bu konuda eğitilecektir.		X		Şikayet kayıtları		X		İLBANK PUB (uygulama)	
Yakındaki topluluk üzerinde toz ve gürültü etkileri	- Projenin inşaat aşamasında Hava Kalitesi Yönetim Planı hazırlanacak ve uygulanacaktır. - Özellikle kuru hava koşullarında önemli toz emisyonlarını önlemek için gerektiğinde (örneğin mobil sulama araçları kullanılarak) transfer yollarına su püskürtülecektir - C-ESMP'nin bir parçası olarak bir Gürültü Yönetim Planı hazırlanacak ve Projenin inşaat aşamasında uygulanacaktır. - Yüklenici, Proje inşaat aşamasında alınan şikayetlerin yoğunluğuna göre toz ve gürültü ölçümleri yapacaktır. - Toplumu inşaat sırasındaki olumsuz etkilerden (gürültü, toz, malzeme ve tehlikeli maddelerle ilgili diğer emisyon riskleri ve kazalar, vb) korumak için kilit önlemlerin uygulanmasına yönelik taahhütleri içeren bir Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planı hazırlanacaktır. - Alt proje Elbistan ilçe merkezinde uygulanacağından, gürültü kirliliğini önlemek için gece çalışmalarına izin verilmeyecektir.		X		Şikayet kayıtları		X		Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	
Can ve yangın güvenliği	- Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı hazırlanacak ve uygulanacaktır. - Çalışma ofisleri ve işçi konaklama alanları için gerekli önlemler alınacaktır. Acil durum toplanma alanları ve işaretleri, kaçış yolları ve işaretleri ile acil durum uyarı sistemleri kurulacaktır.		X		Görsel inceleme		X		Yüklenici (uygulama)	

		Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı				
Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Planlama	İnşaat	Operasyon		Süreklili	Aylık	Üç Aylık	Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
	İşçilerin konaklama kamp alanlarında yeterli ve kolay erişilebilir yangın söndürücüler ve ekipmanlar bulundurulacaktır.								Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	
Güvenlik	- Güvenlik, toplumun güvenliğini veya Proje Şirketinin toplumla ilişkisini tehlikeye atmayacak ve ulusal gereklilikler ve uluslararası standartlarla tutarlı bir şekilde sağlanacaktır. Şikayet mekanizması, toplulukların ve işçilerin güvenlik sorunları ve güvenlik personelinin davranışları ile ilgili endişelerini dile getirmelerine olanak sağlayacaktır. - İşçilerin konakladığı kamp alanına izinsiz giriş ve çıkışları önlemek için özel güvenlik birimleri kurulacaktır.		X				X		Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama)	
ARAZİ EDİNİMİ VE İSTEMSİZ YENİDEN YERLEŞİM										
Fiziksel/ekonomik yerinden edilme de dahil olmak üzere arazi ile ilgili etkiler	- Bitki örtüsüne, tarım arazilerine ve yapılarına, meralara, hayvancılık tesislerine zarar vermekten kaçınılacaktır. - İnşaat faaliyetlerinin yerel halkın sosyal ve ekonomik yaşamını kısıtlamaması/engellememesi sağlanacaktır. - İşçilerin ve ağır ekipmanların Alt Proje için belirlenen çalışma alanını terk etmeden çalışmaları sağlanacaktır. - Proje güzergahı, mevcut hasarlı atık su ve yağmur suyu şebekesi ile aynı olacak ve gönülsüz yeniden yerleşime neden olmayacaktır. - Sosyal Uzman yerel topluluklarla istişareler gerçekleştirecektir. - Alt proje kapsamında herhangi bir kamulaştırma yapılmayacaktır. - Alt proje faaliyetlerinden etkilenen paydaşlar için bir şikayet mekanizması oluşturulacaktır.	X			İstişare Kayıt Formu Şikayet kayıtları Anketler Raporlar Anketler Raporlar	X			Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (etkili şikayet mekanizmasının işletilmesi; uyumun izlenmesi ve raporlama)	

		Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Planlama	İnşaat	Operasyon		Süreklili	Aylık	Üç Aylık		
	Proje çalışma alanı dışındaki özel ve kamu arazilerine girilmeyecek ve bunu önlemek için tüm tedbirler alınacaktır.								KASKİ (PUB tarafından işletilen şikayet mekanizmasını destekler)	
	İşçilerin ve ağır ekipmanların özel mülkiyete girmemesi sağlanacaktır. Çalışmalar, kamulaştırılmadıkça veya irtifak hakkı tesis edilmedikçe veya kiralanmadıkça, İLBANK'ın onayına tabi olan özel mülkiyete ait parseller üzerinde gerçekleştirilmeyecektir.				Şikayet kayıtları	X			Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim)	
KÜLTÜREL MIRAS										
Arkeolojik Alanlara Verilen Zarar	- Kazı çalışmaları sırasında arkeolojik kalıntılara rastlınırsa, çalışmalar durdurulacak ve ÇSYÇ'deki Tesadüfi Buluntular Prosedürü uyarınca ilgili kurumlarla iletişime geçilecektir. Yüklenici böyle bir bulguyu derhal (24 saat içinde) İşverene ve İLBANK'a bildirecektir. - Yüklenici ve alt yüklenici çalışanları da dahil olmak üzere proje çalışanlarına, tesadüfi buluntuların ortaya çıkması durumunda izlenecek prosedürler hakkında Tesadüfi Buluntu Prosedürü eğitimleri verilecektir. - Elbistan ilçe merkezindeki kutsal yapılar, türbeler ve ibadethanelerin proje sırasında zarar görmemesi için tüm ilgili önlemler alınacaktır. Ekip üyeleri, yerel topluluklar için duygusal değeri olan nesnelere zarar vermemek için çalışmalar başlamadan önce eğitilecek ve bilgilendirilecektir.		X		Şans eseri bulunan kayıtlar Şans bulma prosedürlerine ilişkin eğitim sayısı		X		Yüklenici (uygulama) Denetim Danışmanı (Denetim) PIU (uyumluluğun izlenmesi ve raporlama) KASKİ (tesadüfi buluntularla ilgili yazışmalar için PUB'u desteklemektedir)	

		Aşama			İzleme için Göstergeler	İzleme Sıklığı				
Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Etki Azaltma Önlemleri	Planlama	İnşaat	Operasyon		Süreklili	Aylık	Üç Aylık	Uygulama ve İzleme Sorumluluğu	Tahmini Maliyet ¹
PAYDAŞ KATILIMI										
Şikayet Mekanizması	• Roller ve Sorumluluklar tablosunda belirtildiği üzere; İLBANK, proje için bir Şikayet Mekanizması kuracak ve projenin yaşam döngüsü boyunca etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. • Paydaş Katılım Planı (PKP) ve Şikayet Mekanizmasının uygulanması İLBANK PUB'nin sorumluluğunda olacaktır. • PKP yıllık olarak ve Projede önemli değişiklikler olması durumunda güncellenecektir; • Şikayetlerin ele alınmasından sorumlu personelin iletişim bilgileri de dahil olmak üzere PKP ve Şikayet Mekanizmasının görünürlüğü sağlanacaktır. • Çevredeki toplulukların inşaat faaliyetleriyle ilgili şikayetlerini izlemek ve etkilenen topluluklarla ilişkileri sürdürmek için Sosyal Uzman Topluluk İrtibat Görevlisi atanacaktır. • Şikayet Mekanizmasının erişilebilirliğini ve proje görünürlüğünü artırmak için afişler ve broşürler hazırlanacak ve tüm Elbistan halkına dağıtılacaktır. • Şikayet mekanizması ve diğer kanallar aracılığıyla alınan tüm kayıtlar, İLBANK PUB tarafından proje süresince bir şikayet günlüğüne kaydedilecektir.		X		Şikayet kayıtları Paydaş katılım kayıtları		X		PIU (PKP'nin uygulanması, şikayet mekanizmasının işletilmesi ve raporlama) KASKİ (gerektiğinde PUB'u destekler) Yüklenici (şikayetlerin ele alınmasına yönelik eylemlerin uygulanması) Denetim Danışmanı (denetim)	

5. PAYDAŞ KATILIMI

Elbistan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Projesi (1. ve 2. Aşama) için Halkın Katılımı Toplantısı, 27 Ağustos 2024 tarihinde saat 14:00'te Elbistan Merkez'de yer alan Sayit A Teras ve Café'de gerçekleştirildi. Halkın Katılımı Toplantısı duyuruları, ulusal gazete "Takvim"de yayımlanmış ve KASKİ'nin <https://www.maraskaski.gov.tr/duyuru/terrp-projesi-kapsaminda-elbistan-kisim-1-ve-kisim-2-alt-projeleri-icin-halkin-katilimi-toplantisi/> internet sitesinde duyurulmuştur.

Toplantı, KASKİ (Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve İLBANK temsilcilerinin açılış konuşmalarıyla başladı. Projenin hedefleri, Türkiye'nin yeniden inşa çalışmalarına katkıları ve Dünya Bankası tarafından sağlanan finansman mekanizmaları hakkında genel bilgiler verildi. Kontrol müşavir firması tarafından, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) hakkında detaylı bir sunum yapıldı ve projenin çevresel ve sosyal faydaları ile inşaat aşamasında meydana gelebilecek olumsuz etkiler için planlanan azaltım tedbirleri vurgulandı. Ana başlıklar arasında, toz oluşumu gibi çevresel ve sosyal etkileri azaltmaya yönelik stratejiler ile proje uygulama sürecinde halkla iletişim ve şikayet mekanizması yer aldı.

Toplantıya Belediye, Muhtarlar, İlçe Vatandaşları ve KASKİ gibi kurum ve kuruluşlardan toplam 44 kişi katıldı. Sunumların ardından, mahalle muhtarları başta olmak üzere yerel topluluk üyeleri çeşitli endişelerini dile getirdi. KASKİ ve proje ekibi, Dünya Bankası ve İLBANK standartlarının titizlikle uygulanacağını ve gerekli tüm önlemlerin alınacağını halka temin etti. Toplantı, proje ekibi ile topluluk üyeleri arasında yapıcı bir diyalogla yaklaşık iki saat sürdü.

Toplantı sonucunda, mevcut çevresel ve sosyal yönetim planında ek bir değişikliğin gerekli olmadığı görüldü.

Toplantı tutanakları, toplantı duyuruları, katılımcı listesi ve toplantı fotoğraflarına ilişkin detaylı bilgiler EK-10.3'te yer almaktadır.

6. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM KONTROLLERİ

Projenin inşaat ve işletme aşamalarında, Proje faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkiler olacaktır. Projenin inşaat aşamasındaki potansiyel etkiler genellikle kısa vadeli, düşük ila orta büyüklükte ve yerel olarak önemli olacaktır. Bu etkiler temel olarak trafik, gürültü, titreşim, hava kalitesi, toprak bozulması ve kirlenmesi, atık yönetimi, toplum sağlığı ve güvenliği ile iş ve çalışma koşulları (iş sağlığı ve güvenliği dahil) ile ilgili olacaktır.

Projenin çevresel ve sosyal etkilerini belirlemek, izlemek ve etki azaltıcı önlemleri tanımlamak için hazırlanan bu ÇSYP'ye ek olarak, yüklenici tarafından hazırlanacak olan C-ÇSYP ve diğer alt yönetim planları etkileri en aza indirecek ve proaktif bir çalışma sağlayacaktır.

Yüklenici, inşaat işlerine başlamadan önce Yüklenici Çevresel ve Sosyal Yönetim Planını ve Altyapı Yönetim Planlarını hazırlayacak ve danışman kontrolünden sonra onay için İLBANK PUB'a sunacaktır.

Yüklenici tarafından hazırlanacak alt yönetim planları aşağıdaki gibi olacaktır.

1. Hava Kalitesi Yönetim Planı (Toz Kontrol Yönetim Planı)
2. Gürültü Yönetim Planı
3. Atık Yönetim Planı
4. Su Kaynakları Yönetim Planı
5. Toprak Kirliliği Yönetim Planı
6. Trafik ve Güvenlik Yönetim Planı
7. Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Planı
8. İşgücü Yönetim Planı (proje İYP'sine uygun olarak hazırlanacaktır)
9. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı
10. Paydaş Katılımı Yönetim Planı ve Şikayet Mekanizması

7.EĞİTİM

Farkındalığı artırmak ve sorumlu kapasiteleri geliştirmek için KASKİ Proje Ekibi ve Yüklenicinin yönetim ekibine yönelik bir dizi eğitim verilmelidir.

Bu bağlamda, çevresel ve sosyal eğitimlerden Danışman sorumlu olacaktır. Müşavir'in Çevresel ve Sosyal ekibi, inşaat işleri başlamadan önce KASKİ Proje Ekibi'nin tüm personeline ve Yüklenici'nin yönetimine ve çalışanlarına gerekli eğitimleri verecektir. KASKİ Proje Ekibi için her işe alım sırasında, Danışman ekibin yeni üyesine eğitim verecektir.

KASKİ Proje Ekibine yönelik eğitimlerin ana konuları şu şekilde sıralanmaktadır;

- Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı ve İzleme Planının içeriği hakkında kısa bir bilgi,
- Çevresel ve sosyal etki azaltma prosedürlerine ilişkin sorumluluklar ve önlemlerin uygulanmasının izlenmesi,
- Toprak kirliliği kontrolü,
- Atık yönetimi,
- Su kirliliği kontrolü,
- Hava kalitesi,
- Gürültü kontrolü,
- Biyolojik çevrenin korunması,
- Toplum sağlığı ve güvenliği,

- Şikayet mekanizması,
- Arazi edinimi ve gönülsüz (fiziksel ve ekonomik) yeniden yerleşim ile ilgili gereklilikler,
- İSG önlemleri ve acil durum hazırlığı ve müdahalesi,
- Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartları.

Danışman, Yüklenicinin kendi personeli için de aynı eğitimleri vermesini sağlayacaktır. Denetim Danışmanı, Yüklenicinin eğitim faaliyetlerini izlemekten sorumludur. Yüklenicinin her işe alımında, Yüklenici yeni personeli eğitecektir.

Yüklenici(ler), altı ayda bir ve yüklenicinin kendisi veya Danışman tarafından gerekli görüldüğünde personeline eğitimi tekrarlayacaktır.

Yüklenicilere yönelik eğitimlerin ana konuları aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

- Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı ve İzleme Planının içeriği hakkında kısa bir bilgi,
- Çevresel ve sosyal etki azaltma prosedürlerine ilişkin sorumluluklar,
- Toprak kirliliği kontrolü,
- Atık yönetimi,
- Su kirliliği kontrolü,
- Hava kalitesi,
- Gürültü kontrolü,
- Biyolojik çevrenin korunması,
- Toplum sağlığı ve güvenliği,
- Şikayet mekanizması,
- Alet kutusu konuşmaları,
- İSG önlemleri ve acil durum hazırlığı ve müdahalesi,
- İşe özel görüşmeler,
- Davranış Kuralları.

Ayrıca, yüklenici, KASKİ ve Danışman ulusal mevzuat uyarınca zorunlu eğitimleri almalıdır.

8. İZLEME VE RAPORLAMA

İzleme, belirlenen azaltım yönetim stratejilerinin uygulanmasının sürekliliğini ve etkinliğini sağlamada kilit bir rol oynar. İzleme Planının temel amacı, bu ÇSYP'de öngörülen tedbirlerin ve gerekliliklerin uygulanmasını değerlendirmektir. İzleme yoluyla elde edilen bilgiler, Projenin tüm aşamalarında yönetim planlarını iyileştirmek için kullanılabilir. Etki değerlendirmesi, ilgili tüm potansiyel etkileri kapsayarak bunların önemini belirlemeye ve bu etkilere uygun yanıtları içermeye çalışsa da, izleme yoluyla elde edilen bilgiler sayesinde sorun haline gelmeden önce yönetilebilecek veya azaltılabilecek beklenmedik etkiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle izleme, yönetim planlarının başarıyla uygulandığından ve çevrenin Projenin tüm aşamalarında iyi uygulamalar yoluyla korunduğundan emin olunmasını sağlar.

Yükleniciler, gözetim müşavirinin kontrolü altında ve İLBANK Proje Uygulama Birimi (PUB) denetiminde, ÇYS risk yönetimi belgelerinde (ÇSYP'lerde) yer alan azaltım tedbirlerini uygulamaktan sorumlu olacak ve ilgili ihale belgelerinde ve sözleşmelerde belirtilen kriterlere uygun olarak, İLBANK PUB'a gözetim müşaviri aracılığıyla aylık, üç aylık ve altı aylık Çevresel ve Sosyal İzleme Raporlarını (ÇSİR) sunacaklardır.

Alt projelerin ÇŞGS performansı, sorumlu yüklenicinin ÇS ekibi tarafından günlük olarak izlenecek ve ekip, saha bulgularını aylık olarak gözden geçirilmesi için gözetim müşavirine raporlayacaktır. Gözetim müşaviri, kendi saha denetim bulgularını kontrol edecek ve ekleyerek konsolide raporları İLBANK PUB'a sunacaktır. İLBANK PUB, bu raporları inceleme için yerel PMK ile paylaşma hakkına sahiptir.

Yükleniciler tarafından hazırlanacak ÇS Raporları, İLBANK tarafından hazırlanan rapor formatını kullanacaktır. Bu raporlar, raporun kapsadığı dönemi takip eden ayın ilk haftasında İLBANK'a sunulmak üzere müşavire gönderilecektir. Raporda yer alan ekler ve destekleyici belgeler de raporla birlikte sunulacaktır.

Yükleniciler tarafından hazırlanacak Ç&S Raporlarında İLBANK tarafından hazırlanan rapor formatı kullanılacaktır. Bu raporlar, Raporun kapsadığı dönemi takip eden ayın ilk haftası içinde İLBANK'a sunulmak üzere Danışmana gönderilecektir. Raporda yer alan ekler ve destekleyici belgeler de raporla birlikte sunulacaktır.

9. UYGULAMA TAKVİMİ VE BÜTÇE KAYNAKLARI

Bu başlık altında, ÇSYP'nin uygulanmasına yönelik harcama kalemleri sunulmaktadır. ÇSYP bütçe kaynağı şu şekilde verilmiştir Tablo 4.

Tablo 4. ÇSYP Bütçe Kaynakları

Bütçe Kalemi	Bütçe kaynağı
İLBANK PUB için çevresel, sosyal ve İSG uzmanlarının (her disiplin için bir uzman) işe alınması İLBANK PUB tarafından uyumun izlenmesi ve raporlama	Daimi uzmanlar İLBANK bütçesinden, danışman uzmanlar ise TERRP/Bileşen 4.1 bütçesinden finanse edilecektir.
KASKİ için sosyal odak noktasının atanması	KASKİ'nin kendi bütçesinden finanse edilecektir (*)
Kontrol danışmanlığı için çevresel, sosyal ve İSG uzmanlarının (her disiplin için bir uzman) işe alınması	Denetim Danışmanının bütçesine dahildir (**)
Yüklenici için çevresel, sosyal ve İSG uzmanlarının (her disiplin için bir uzman) işe alınması	Yüklenicinin bütçesine dahildir (**)
ÇSYP önlemlerinin uygulanması	Yüklenicinin bütçesine dahildir (***)
ÇSYP Ölçümlerinin ve gerektiğinde laboratuvar analizlerinin gözetim danışmanı tarafından izlenmesi	Gözetim Danışmanının bütçesine dahildir

(*) Bu pozisyonlara KASKİ kadrolu personeli atanacağı için Proje bütçesine ekstra bir maliyet getirmeyecektir.

(**) Uzmanların işe alımları, gözetim danışmanlık hizmetleri bütçesi kapsamında finanse edilir. İlgili maliyet tahminleri, danışman seçiminin ilk aşamasında dikkate alınır. Yükleniciler, tekliflerinin kapsamı ve fiyatı dahilinde ÇSYP'nin uygulanması ve izlenmesi için çevresel, sosyal ve İSG uzmanlarını işe almakla yükümlüdür. Bu aşamada uzman başına aylık maliyet tahmini 1.000 €/ay'dır)

(***) Laboratuvar ve test yükümlülükleri ve ilgili raporlama sorumluluğu, inşaat süresi ve kusur sorumluluk süresi boyunca iş sözleşmesinde yer alacaktır. Daha sonra işletme aşaması için bu sorumluluk KASKİ'ye devredilecektir.

"Elbistan (Kahramanmaraş) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Yapım İş'i" yatırımının 2024-2027 döneminde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca kusur sorumluluk süresi için bir yıl daha süre verilecektir.

Bu projeler için iki iş sözleşmesi öngörülmektedir. İhale dokümanlarının İLBANK tarafından hazırlanması ve ihale sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi inşaat sözleşmesinin 24 ay sürmesi planlanmaktadır. Buna ek olarak, yüklenicinin yeni inşa edilen tesislerin onarımından sorumlu olacağı bir yıllık bir Kusur Sorumluluk Dönemi planlanmaktadır.

Zaman çizelgesi aşağıda verilmiştir.


Tablo 3. Proje Uygulama Zaman Çizelgesi

HAYIR	YIL	2024				2025				2026				2027				2028			
	Alt Bileşen / Aylar	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Elbistan (Kahramanmaraş) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri İnşaatı																				
	Yatırım ve İhale Belgeleri																				
	İnşaat Faaliyetleri																				
	Kusur Sorumluluk Süresi																				

Bu alt proje ile Elbistan İlçesinin altyapı ihtiyaçlarına kısa ve uzun vadede acil çözüm sağlanması hedeflenmektedir.

10. EKLER

9.1. Paydaş Katılımı ve Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısı Tutanağı

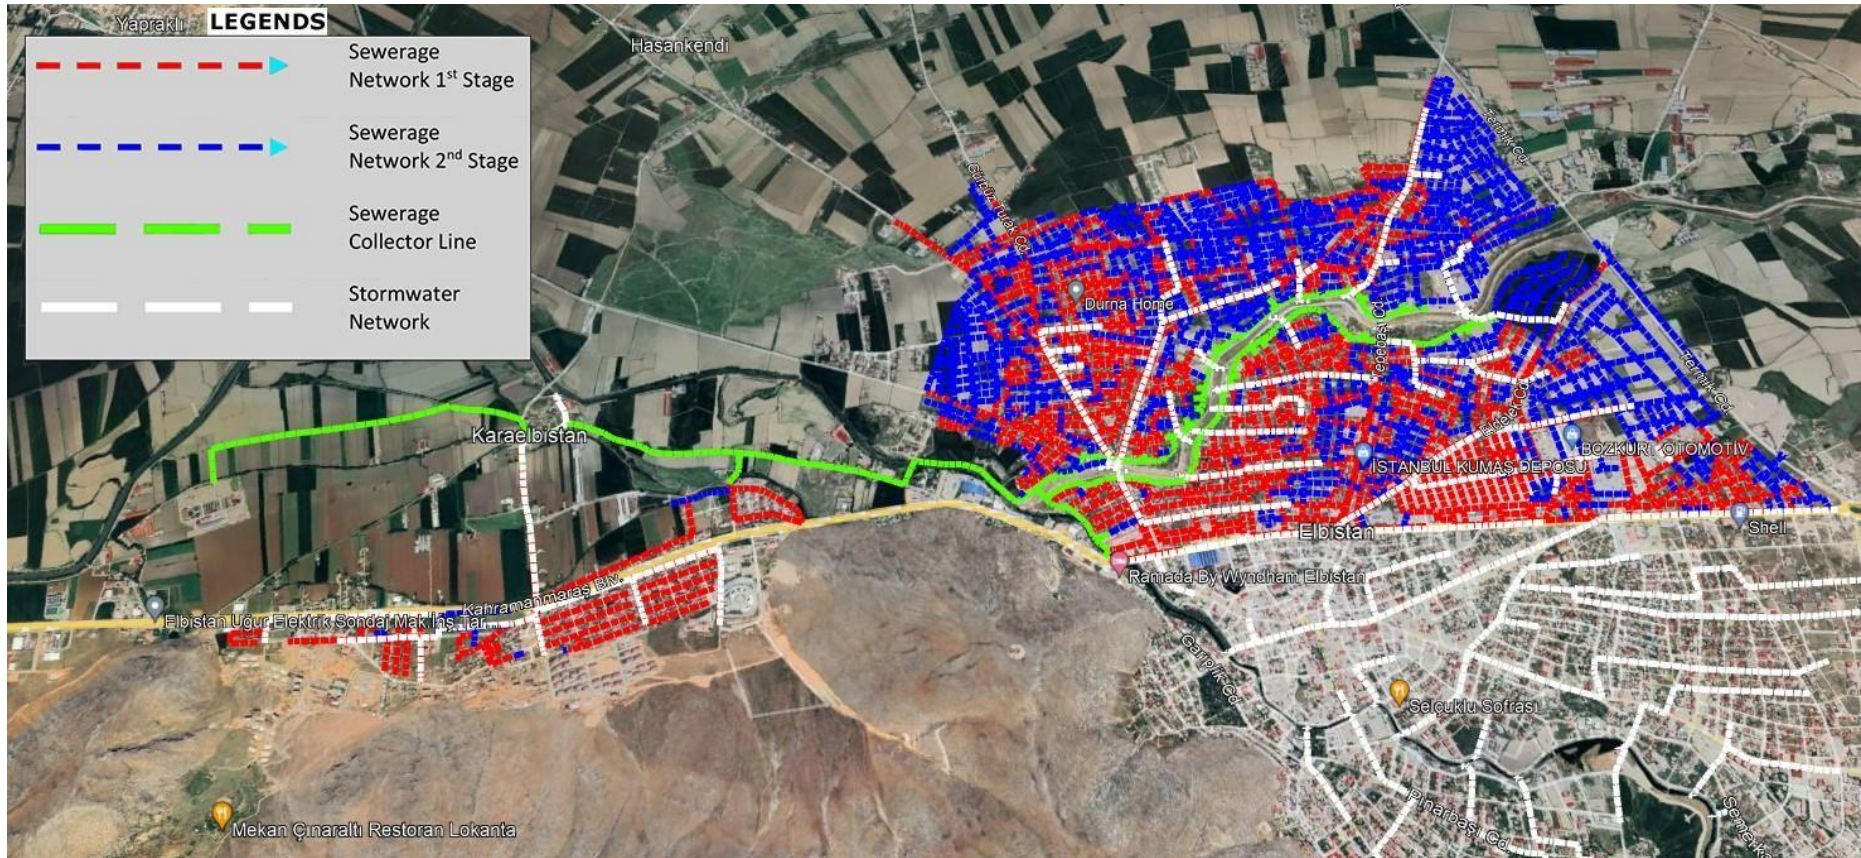10.1. Elbistan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri Yerleşim Planları

10.2. İzinler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ÇED Kapsam Değerlendirmesine ilişkin Görüş Yazısı eklenecektir.

10.3. Paydaş Katılımı ve Halkın Bilgilendirilmesi Toplantı Tutanağı

**TÜRKİYE DEPREM İYİLEŞTİRME VE
YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ
(P180849) (TERRP)
ELBİSTAN KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKE PROJESİ (1.
ETAP)**

*Revizyon : REV.00
Toplantı Tarihi : 27 Ağustos 2024,14:00
Toplantı Yeri: Sayit A Teras ve Cafe*

İLBANK-TERRP-Elbistan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Projesi (1. Kısım)

Bu Halkın Katılımı Toplantı Tutanağı, Dünya Bankası (DB) tarafından desteklenen Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma Projesi (P180849) (TERRP) ELBİSTAN KANALİZASYON VE DEPREM SUYU ŞEBEKESİ PROJESİ (1. ETAP) kapsamında İLBANK A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. İLBANK'ın izni olmaksızın baskı, fotokopi veya başka bir yolla çoğaltılamaz ve/veya yayınlanamaz; bu izin olmaksızın üretildikleri amaç dışında kullanılamaz.

1. HALK KATILIM TOPLANTISI

ELBİSTAN KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKESİ PROJESİ (1.ve 2. ETAP), şehrin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla TERRP kapsamında Dünya Bankası tarafından finanse edilmektedir. Projenin uygulanmasından İLBANK sorumludur.

TERRP'nin ÇSYÇ'si ve Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Standartları uyarınca, bir Çevresel ve Sosyal Tarama çalışması yapılmış ve Projenin Ç&S risk sınıflandırması Elbistan için "Orta" olarak belirlenmiştir. Buna göre, Proje için bu Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) hazırlanmıştır.

ÇSYP'nin bir gereği olarak 27 Ağustos 2024 tarihinde saat 14:00'te Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmiştir.

1.1.Özet

Halkın Katılımı Toplantısı'nda danışman firma Liv Mühendislik tarafından proje hakkında bilgi verildi. Detaylar aşağıdaki gibidir:

Toplantının açılış konuşması KASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Altunok ve İLBANK Genel Müdürlüğü'nden Gülçin Hoşafcı tarafından yapıldı. Proje hakkında genel bilgi verilerek projenin amacı anlatıldı.

KASKİ Genel Müdür Yardımcısı, bölgede yapılacak faaliyetler ve proje yürütülürken bunu takip edeceklerini ve bundan sonra da çalışmaların devam edeceği bilgisini verdi. DB finansmanlı Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma Projesi (TERRP), bu projenin neden oluşturulduğu ve proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında genel bilgi verildi.

Elbistan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Projesi (1. Ve 2. Etap) Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) hakkında genel bilgilendirme ve ÇSYP'nin neden hazırlandığı, projenin çevresel ve sosyal risklerinin ÇSYP kapsamında değerlendirildiği bilgileri danışmanlık firmasından Nejdett Buluş-Çevre Uzmanı tarafından verildi. Projenin ilçeye sağlayacağı katkılar ve proje hakkında teknik bilgiler verilerek, projenin halka nasıl fayda sağlayacağı, inşaat faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği ve proje kapsamında inşaat faaliyetlerinin etkilerinin nasıl önleneceğinin önemi vurgulandı. Ayrıca müşavir firmadan Sosyal Uzman Serkan Delidere tarafından projelerin sosyal riskleri ve faydaları, alt proje uygulandığında halkın nasıl bilgilendirileceği ve şikayetlerin nasıl iletilebileceği hakkında detaylı bilgi verildi.

1.2.Soru ve Cevap Oturumu

Bu alt bölümde, Halkın Katılımı Toplantısı sırasında katılımcıların görüş, talep ve soruları ile bunlara ilişkin alınan cevaplar sunulmuştur. Detaylar aşağıdaki gibidir:

Soru - Muhtar (Yeşilyurt Mahallesi): Her mahallede çalışmaların ne zaman yapılacağı belli mi? Ve çalışmalar başlamadan önce bu bilgiyi bizimle paylaşmanız mümkün mü?

Cevap: Yüklenici firma bu inşaat planlamasını hazırlayacak ve müşavir firmaya ve İLBANK'a sunacaktır. Daha sonra çalışma planı muhtarlarla paylaşılacaktır.

Soru - Muhtar (Battalgazi Mahallesi): 2023 yılında mahallemizde başka bir proje kapsamında kazı çalışmaları yapıldı. Tozuma ilgili yeterli önlemler alınmadı. Acaba bahsettiğiniz risk azaltıcı önlemler ve bunlara uyma zorunluluğu projenizde uygulanacak mı? Önlemlerin uygulanmaması mümkün mü?

Cevap: Bugün görüştüğümüz projeler Dünya Bankası tarafından finanse edilen projeler olduğu için Dünya Bankası'nın performans standartları uygulanacaktır. Bu nedenle ÇSYP 'da belirtilen tedbirler uygulanacaktır. Tozuma konusu da dahil olmak üzere risk azaltma önlemleri uygulanacaktır.

Soru - Muhtar (Güneşli Mahallesi): Kanalizasyon hattında bazı rögarlar tıkalı. Bu projenin faaliyetleri başlamadan önce rögarlar temizlenebilir mi?

Cevap-KASKİ: 10-15 gün sonra KASKİ ekipleri bu temizliği yapacaktır.

Soru - Muhtar (Battalgazi Mahallesi): Proje faaliyetleri öncelikle bizim mahallemizde yürütülebilir mi?

Cevap: İnşaat planlaması mühendislik tasarımı ve hesaplamalarına göre yapılmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir mahallede bu kriterler göz ardı edilerek öncelik vermek mümkün değildir.

Tüm katılımcı muhtarlardan öneri: Buradaki insanlar depremden sonra yoğunlaşan inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan tozdan çok rahatsız. Kazı yapılmayan yer neredeyse kalmadı, bu nedenle asfalt kaplamaların çok fazla bekletilmeden yapılması gerekiyor.

1.3 Sonuç

Halkın Katılımı Toplantısı, müşavir firma yetkililerinin proje hakkında bilgi vermesi ve sonrasında gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ile yaklaşık iki saat sürmüştür. ELBİSTAN KANALİZASYON VE DEPREM SUYU PROJESİ (1. Ve 2. ETAP) hakkında halka gerekli bilgiler verilmiş ve soruları yanıtlanmıştır.

2.KATILIMCI LİSTESİ

TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI / MEETING ATTENDANCE SHEET					
Contract / Sözleşme					
Meeting / Toplantı:		Pazlaş Katılımı ve Halları Bilgilendirilmesi			
Date & Time / Tarih & Saat		27.08.2024 14:00			
Place / Yer:		Elbistan			
	Name / İsim	Title / Unvan	Institution / Kurum	E-Mail / E-Posta	Signature / İmza
1.	Mustafa	Gen. Md. Yard.	KASKİ	m.altunok@maraskas	
2.	Mehmet A.	İlçe Hizmetleri Daire Başkanı	KASKİ	m.guner@maraskas	
3.	Dilaver Y.	K.Şb. mcd	KASKİ	1.yakut@maraskas	
4.	Hasan K.	Elb. Bld. Akademi Şefi	Elb. Bld.	hasan.kayimoglu@elb.	
5.	Musa C.	Elb. bld. beş. yard.	Elb. bld.	musac@elbistan.gov.tr	
6.	Ali K.	Yeşilyurt mah. muhtarı	muhtar	alikilic49@hotmail	
7.	Hasan K.	Orhangazi mah.	muhtar	hasan.demir	
8.	Albayrak	Korelbiçe mah.	muhtar		
9.	DAVUT D.	Girebimahi mah.	muhtar		
10.	Haydar	Güneşli Mah.	Muhtar	haydar@hotmail	
11.	Turgay	Battalgazi Muh.	Muhtar		
12.	İbrahim	Akşakal mah.	Muhtar		



T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
İLBANK
THE WORLD BANK



İBANCONSULT AŞI
Consulting Engineers

Şekil 1: Katılımcı İmzaları, Liste-1

TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI / MEETING ATTENDANCE SHEET					
Contract / Sözleşme					
Meeting / Toplantı:		Paydaş Katılımı ve Halkın Bilgilendirilmesi			
Date & Time / Tarih & Saat		27.08.2024 14:00			
Place / Yer:		Elbistan			

	Name / İsim	Title / Unvan	Institution / Kurum	E-Mail / E-Posta	Signature / İmza
1.	Ferit	Kaymakamlık Elbistan	Elbistan		
2.	Selma	Karaburun	Muhhtar		
3.	Yusuf	Karaburun	Muhhtar		
4.	Mahzen	Karaburun	Muhhtar		
5.	Bilal	Atmak Kasası	Muhhtar		
6.	Hassan	Muhhtar	Cumhuriyet		
7.	Hüseyin	Muhhtar	Şatıra		
8.	Erhan	Muhhtar	cehan		
9.	Kemal	MUHHTAR	Kızılcada		
10.	Mehmet	Muhhtar	Köprübaşı		
11.	Turgut	Muhhtar	Bahçelievler		
12.	Hakan	Muhhtar	incecik		





T.C. ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

İLBANK
TÜRKİYE NİH YATIRICI GRUPO

THE WORLD BANK
IBRD • IFC • WORLD BANK GROUP



İBANCONSULT AGM
Consulting Engineers

Şekil 2: Katılımcı İmzaları, Liste-2

TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI / MEETING ATTENDANCE SHEET					
Contract / Sözleşme					
Meeting / Toplantı:		Pagula Katılımı ve Halkın Bilgilendirilmesi			
Date & Time / Tarih & Saat		27.08.2024 14:00			
Place / Yer:		Elbistan			
	Name / İsim	Title / Unvan	Institution / Kurum	E-Mail / E-Posta	Signature / İmza
1.	Süleyman	Muhhtar	Toprak Hisar		
2.	Ali	Muhhtar	Topallı		
3.	Hakan	Proje Müdürü	Liv-Liban		
4.	İbrahim	İns. Yönl. Müh.	Gün İnşaat A.Ş.		
5.	Servet	Proje Şefi	Liv-Liban		
6.	İbrahim	İnşaat Müdürü	KASKİ		
7.	Yusuf	Kanalizasyon Sorumlusu	KASKİ ELBİ		
8.	Cemal	Eden Eter	KASKİ		
9.	Mehmet	İdari İşler	KASKİ ELBİ		
10.	İlhan	Çevre Korum. Böl. Mnd.	İL BANK		
11.	Halil	KASKİ	Basın Yayın		
12.	Çınar	Beşir	Elbistan Bld.		





T.C. ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

İL BANK
TÜRKİYE İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI

THE WORLD BANK
8001 - 10A | WORLD BANK GROUP



İBANCONSULT AGM
Consulting Engineers

Şekil 3: Katılımcı İmzaları, Liste -3

TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI / MEETING ATTENDANCE SHEET					
Contract / Sözleşme					
Meeting / Toplantı:		Paydaş Katılımı ve Halkın Bilgilendirilme			
Date & Time / Tarih & Saat		29.08.2024 14:00			
Place / Yer:		Elbistan			
	Name / İsim	Title / Unvan	Institution / Kurum	E-Mail / E-Posta	Signature / İmza
1.	M. SAKIM	Proje dld	Liv. EAG	m.sakim.dereci@liv-engineering.com	
2.	Öğretmen	Yatırımcı			
3.	Turgut	Kaski Başkan	KASKİ		
4.	Muhammed	Kaski	Kaski		
5.	Sertan	Sosyal Uzman	Liv. Mühendislik		
6.	Nejdet	Genel Uzman	Liv. Mühendislik		
7.	Gökten Hoş	Mühendis	İLBANK	ghosafci@ilbank.gov.tr	
8.	İsmail Kar	Mühendis	İLBANK	isyrn@ilbank.gov.tr	
9.					
10.					
11.					
12.					



T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
İLBANK
THE WORLD BANK

Şekil 4: Katılımcı İmzaları, Liste -4

3. Ekler

Ek 1: Halk Katılım Toplantısı Fotoğrafları



Şekil 5: Toplantı Fotoğrafı-1



Şekil 6: Toplantı Fotoğrafı-2



Şekil 7: Toplantı Fotoğrafı-3



Şekil 8: Toplantı Fotoğrafı-4

Ek 2: Gazete İlanları

uzatıcı ve ya da yavaşlatıcı
dikkat çekti.

da güçlendiriyor" dedi.

ödemenen gruplar yavaşlatıcı amma
bir sistem mülaka kuracı

TOPLANTI İLANI

ELBİSTAN KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKESİ 1. KADEME İNŞAAT PROJESİ

Paydaş Katılımı ve Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısı

İLBANK tarafından Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesinde Ka-
nalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesi 1. Kademeye İnşaat Projesi
yürütülmektedir. Aşağıda belirtilen tarih ve saatte proje ile ilgili pay-
daşları ve halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için "Pay-
daş Katılımı ve Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısı" yapılacaktır.

Halkımıza saygı ile duyurulur.

İlgili belgelere aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:
[https://www.ilbank.gov.tr/storage/uploads/uldb/elbistan_kanali-
zasyon_yagmursuyu_csyp_1kisim_1723795188.pdf](https://www.ilbank.gov.tr/storage/uploads/uldb/elbistan_kanali-
zasyon_yagmursuyu_csyp_1kisim_1723795188.pdf)

Toplantı Yeri : SEYİT A Cafe
Toplantı Yerin Adresi : Piratbaşı Mah. Piratbaşı Cad. No: 128/2,
Elbistan/ Kahramanmaraş

Toplantı Tarihi : 27/08/2024
Toplantı Saati : 14:00
Proje Sahibi : İLBANK
Tel. : 0 (312) 508 70 00
Mali : p.yabaci@ilbank.gov.tr
https://www.ilbank.gov.tr/form/bilgilendirilmeustulanasari

Müşavir Firma : Liv Mühendislik-Libanconsulting Ortaklığı
Tel : 0 (312) 809 22 59
Mali : info@liveengineering.com

TOPLANTI İLANI

ELBİSTAN KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKESİ 2. KADEME İNŞAAT PROJESİ

Paydaş Katılımı ve Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısı

İLBANK tarafından Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesinde Ka-
nalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesi 2. Kademeye İnşaat Projesi
yürütülmektedir. Aşağıda belirtilen tarih ve saatte proje ile ilgili pay-
daşları ve halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için "Pay-
daş Katılımı ve Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısı" yapılacaktır.

Halkımıza saygı ile duyurulur.

İlgili belgelere aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:
[https://www.ilbank.gov.tr/storage/uploads/uldb/terp_elbistan_kana-
lizasyon_yagmursuyu_csyp_2kisim_1724080392.pdf](https://www.ilbank.gov.tr/storage/uploads/uldb/terp_elbistan_kana-
lizasyon_yagmursuyu_csyp_2kisim_1724080392.pdf)

Toplantı Yeri : SEYİT A Cafe
Toplantı Yerin Adresi : Piratbaşı Mah. Piratbaşı Cad. No: 128/2,
Elbistan/ Kahramanmaraş

Toplantı Tarihi : 27/08/2024
Toplantı Saati : 14:00
Proje Sahibi : İLBANK
Tel. : 0 (312) 508 70 00
Mali : p.yabaci@ilbank.gov.tr
https://www.ilbank.gov.tr/form/bilgilendirilmeustulanasari

Müşavir Firma : Liv Mühendislik-Libanconsulting Ortaklığı
Tel : 0 (312) 809 22 59
Mali : info@liveengineering.com

Tel
Faks
Web

Şekil 8: Takvim Gazetesi'nin Halkın Katılımı Toplantıları İçin Verdiği İlanlar

Basılı yerel gazete olmadığı için ulusal bir gazetede yayımlanmıştır.

Ek 3: İLBANK Tarafından Yapılan Toplantı Duyurusu

TOPLANTI İLANI

**ELBİSTAN KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKESİ
1. KADEME İNŞAAT PROJESİ**

Paydaş Katılımı ve Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısı

İLBANK tarafından Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi'nde Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesi 1. Kademe İnşaat Projesi yürütülecektir. Aşağıda belirtilen tarih ve saatte proje ile ilgili paydaşları ve halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için "Paydaş Katılımı ve Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısı" yapılacaktır.

Halkımıza saygı ile duyurulur.

İlgili belgelere aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
https://www.ilbank.gov.tr/storage/uploads/uidb/elbistan_kanalizasyon_yagmursuyu_csyp_1kisim_1723795188.pdf

Toplantı Yeri: SEYİT A Cafe
Toplantı Yerin Adresi: Pınarbaşı Mah, Pınarbaşı Cad, No: 128/2, Elbistan/ Kahramanmaraş
Toplantı Tarihi: 26/08/2024
Toplantı Saati: 14:00

Proje Sahibi: İLBANK
Tel: 03125087000
Mail: pybafet@ilbank.gov.tr
<https://www.ilbank.gov.tr/form/bilgilendirmeuluslararası>

Müşavir Firma: Liv Mühendislik-Libanconsult İş Ortaklığı
Tel : 03128092259
Mail: info@livengineering.com


Şekil 9: İLBANK Tarafından Yapılan Toplantı Duyurusu

Ek 4: ÇSYP ve Halkın Katılımı Toplantısı ile İlgili Doküman ve Duyurular İLBANK ve KASKİ Resmi İnternet Sitesinde Yayınlandı



The screenshot shows the official website of KASKİ Genel Müdürlüğü. The header includes the website URL 'maraskaski.gov.tr/' and the KASKİ logo. A blue navigation bar contains a menu icon and a button labeled 'Online İşlemler'. The main content area features a blue link 'Duyuru' followed by a large, bold title: 'TERRP projesi kapsamında Elbistan kısım 1 ve kısım 2 alt projeleri için Halkın Katılımı Toplantısı'. Below the title, the date '22 Ağu 2024' is displayed with a calendar icon. A row of social media sharing icons (Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, LinkedIn, Email, and Print) is provided. The announcement text states: 'TERRP projesi kapsamında Elbistan kısım 1 ve kısım 2 alt projeleri için Halkın Katılımı Toplantısı 27/08/2024 Salı Günü Saat:14:00 te Elbistan Seyit A Cafe'de yapılacaktır. İlanen duyurulur.'

Şekil 10: KASKİ'nin Yaptığı Halk Katılım Toplantısı Duyurusu



Şekil 11: ÇSYP Belgeleri İLBANK'ın Resmi Web Sitesinde Yayınlandı



T.C.
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı



GÜNLÜDÜR
21.08.2024

Sayı : E-10299408-730-24024
Konu : Elbistan (Kahramanmaraş)
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projesi 1.
Kısım ve 2. Kısım, Paydaş Katılımı ve
Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısı

DAĞITIM YERLERİNE

Dünya Bankası ile yürütülen görüşmeler çerçevesinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı "Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi" finansmanının sağlanması amacıyla 01/09/2023 tarihinde Dünya Bankası ile 9580-TR No.lu Kredi Anlaşması imzalayarak finansman temin etmiştir.

Dünya Bankası finansmanının Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illere karşılıksız olarak verildiği Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi 1. Bileşeni içerisinde yer alan çevresel altyapı projeleri İLBANK tarafından gerçekleştirilecektir.

Bahse konu proje kapsamında gerçekleştirilecek olan Elbistan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projesi 1. Kısım ve 2. Kısım için hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Türk Çevre Mevzuatı ve Dünya Bankası çevresel ve sosyal standartlarına uygun olup 26.06.2024 tarihinde İLBANK'ın internet sayfasında yayınlanmıştır. Aşağıdaki karekod ile erişilebilen işbu dokümanın amacı inşaat öncesi ve inşaat süresi boyunca projenin çevresel ve sosyal etkilerinin yüklenicilerle, yerel yönetimlerle ve diğer paydaşlarla nasıl yönetileceği konusunda yol gösterici olmasıdır.

Bu bağlamda, Elbistan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projesi 1. Kısım ve 2. Kısım kapsamı, çevresel ve sosyal yönetimi hakkında bilgi verilmesi amacıyla, 27.08.2024 Salı günü saat 14:00'da Seyit A. Teras ve Café'de, Paydaş Katılımı ve Halkın Bilgilendirilmesi toplantısı yapılacaktır. Ekte ilan metni ve broşürü iletilen söz konusu toplantıya kurumunuzu temsilen katılımcıların iştirak etmesinin sağlanması konusunda gereğini arz/rica ederiz.



Nevzat TOĞRUL
Müdür V.

Şevket Altuğ TAŞDEMİR
Daire Başkanı

Ek:
1. 1. Kısım Paydaş Katılımı ve

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: EB71008E56 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/iller-bankasi-ebys>
Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 9/21 R.Blok (Merkez Ankara) Yenimahalle/Ankara Bilgi İçin: Gülçin HOŞAFÇI
Telefon No: 0 (312) 508 70 00 Faks No: Uzman: Mühendis
İnternet Adresi: www.illerbank.gov.tr Tel: 7915
Kep Adresi: illerbankasi@hs01.kep.tr E-Posta: ghosafci@ilbank.gov.tr
İller Bankası Anonim Şirketi T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İlgili Kuruluşudur.



Şekil 12: Paydaşların HKT'ye Davet Edilmesine İlişkin İLBANK'ın Resmi Mektubu

Ek 5: Elbistan Belediyesi Halkın Katılımı Toplantısı Broşürü



Trafik Yönetimi

İlgili kurumlardan yol kapatma izinleri alınacak ve ilçe halkının mağdur olmaması için alternatif güzergahlar belirlenecektir. Yaya trafiğini sağlamak ve kazaları önlemek için kazı alanları güvenlik bariyerleri ile çevrelenecektir. Özellikle Elbistan'ın merkezinde, iş yerlerine ve yerleşim alanlarına erişimi engellemek ve yaya trafiğini yönetmek için yayaaların güvenli kullanabileceği korkuluklu platformlar kullanılacaktır.

Toplum Sağlığı ve Güvenliği

Kamu sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin önemi konusunda çalışanlara eğitim verilecektir. Yerel halkla teması en aza indirmek amacıyla Proje personeli için yeterli kalitede konaklama ve kamp alanı hizmetleri sağlanacaktır. Çalışmalar başlamadan önce bilgilendirme tabelaları yerleştirilerek çalışma alanındaki toplum bilgilendirilecektir. Elbistan merkezde bulunan işyerleri ve ticari kuruluşların ticari faaliyetlerini engellemeyecek şekilde iş planı yapılacaktır. İnşaat faaliyetleri okul, hastane ve cami gibi hassas alanların günlük işleyişini aksatmayacak şekilde sürdürülecektir. Projenin tüm aşamalarında Elbistan yerel kültürü ve değerleri dikkate alınacak ve çalışanlar davranış kuralları konusunda eğitilecektir.

Hava Kalitesi ve Gürültü Yönetimi

Özellikle kuru hava koşullarında inşaat alanlarına ve transfer yollarına gerektiğinde su püskürtülecektir. Hafriyat toprağı taşıyan üstü açık kamyonların üzeri inşaat alanından ayrılmadan önce kapatılacaktır. Sık kullanılan ve uzun süreli nakliye yolları asfaltlanacaktır. Egzoz emisyonlarını en aza indirmek için iş makinelerinin ve kamyonların düzenli olarak bakımları yapılacaktır. Kamyonlar için hız sınırı uygulanacaktır. İnşaat aşamasında mümkün olduğunca 'düşük gürültülü' ekipman kullanılacak, gece çalışmasına izin verilmeyecektir.

Arazi Edinimi

Bitki örtüsüne, tarım arazilerine ve yapılarına, meralara, hayvancılık tesislerine zarar vermekten kaçınılacaktır. İnşaat faaliyetlerinin bölge halkının sosyal ve ekonomik yaşamını kısıtlamaması/engellememesi sağlanacaktır. Proje kapsamında herhangi bir kamulaştırma yapılmayacaktır.

Dilek, Öneri ve Şikayetler

Hem inşaat hem de işletme aşamasında Proje ile ilgili endişe, görüş, şikâyet ve önerilerinizi Yüklenicilere inşaat sahalarına asacakları iletişim kanalları yolu ile İLBANK'a veya ÇİMER'e veya aşağıda yer alan kanalları vasıtasıyla iletebilirsiniz. İletilen şikâyetler hassas bir şekilde ele alınacak ve mümkün olan en kısa zamanda (en fazla 15 iş günü içinde) çözümlü bilgi verilecektir.

İLBANK

Telefon: 0 312 508 79 79

e-posta: bilgiuidb@ilbank.gov.tr

Adres: Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi,
No:9/21, Yenimahalle, Ankara


Web:



<https://www.ilbank.gov.tr/form/bilgiedirmeuluslararasi>

Halkın Katılımı Toplantıları

İLBANK tarafından Elbistan halkının ve projeden etkilenebilecek tarafların endişe, görüş, şikâyet ve önerilerini iletebileceği toplantılar düzenlenecektir. Toplantı duyuruları muhtarlıklara asılacaktır.

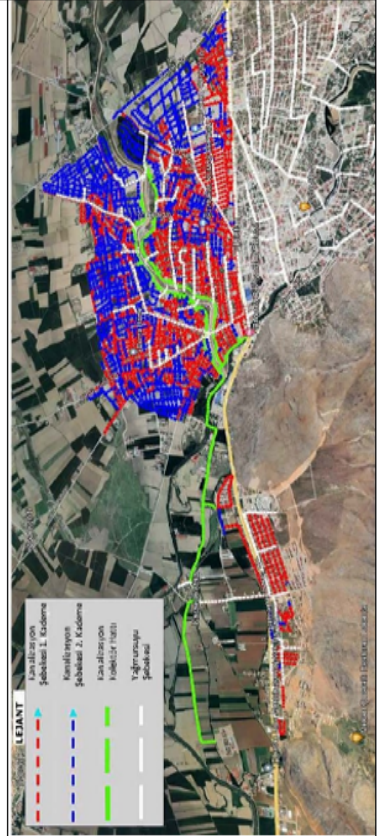

ELBİSTAN
KANALİZASYON VE
YAĞMURSUYU ŞEBEKE
HATTI 1. ETAP İNŞAAT
PROJESİ

Bilgilendirme Broşürü

Ağustos 2024

Projenin Amacı “Elbistan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Hattı 1. Etap İnşaat Projesi”, Dünya Bankası tarafından finanse edilen “Türkiye: Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma Projesi (TERRP)” kapsamında İl Bankası A.Ş. (İLBANK) tarafından yürütülecek alt projelerden biridir. Bu proje ile Elbistan İlçesi’nin 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden hasar gören alt yapısının iklimle dayanaklı olacak şekilde yeniden inşa edilmesi amaçlanmaktadır. Dünya Bankası finansmanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından hibe olarak sağlanmaktadır. İLBANK ise hem Ankara’da bulunan Genel Müdürlük personeli hem de Kahramanmaraş ilçesinde görevlendireceği danışman personel ile projeyi etkili ve hızlı bir şekilde tamamlayacaktır. Projenin inşaat faaliyetlerinin yaklaşık 24 ay süreceği öngörülmektedir. Projenin Kapsamı Bu proje kapsamında eskiden ve deprem nedeniyle hasar gören atıksu şebekesi betonarme ve koruma borular ile yeniden yapılacak buna ek olarak ise bir yağmurlu suyu şebeke batı betonarme borular ile inşa edilecektir. Bunlar ayrı sistemler olarak yapılacak ve böylece hem atıksu şebekesinin kacaklara neden olmaması, hem de yağmurlu suyun atıksu arıtma tesisine yük etimemesi sağlanacaktır. Özet olarak, proje kapsamında; • 121615 m kanalizasyon şebekesi • 18889 m yağmursuyu şebekesi • Kontrol bacaları, parsel bacaları, parsel bağlantıları yapımı yer almaktadır.	Projenin Çevresel ve Sosyal Etkileri ve Alınması Planlanan Önlemler Projenin inşaat aşamasında, diğer tüm inşaat işlerinde olduğu gibi ilçe halkının karşılaşılabileceği bazı geçici, kısa süreli olumsuz etkiler olabilecektir. Dünya Bankası tarafından finanse edilen tüm projelerde olduğu gibi bu projede de ilçe halkının ve çevrenin bu etkilerden en az şekilde etkilenmesini sağlamak için İLBANK tarafından bir “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı” oluşturulmuştur. Burada kısaca bahsedilen plana aşağıdaki barkodu kullanarak, İLBANK’ın internet sitesinden de ulaşabilirsiniz.  https://www.ilbank.gov.tr/uidb/turkiye-deprem-sonrasi-iyilestirme-ve-yeniden-imar-projesi/accordion/823 Yüzey Sularının Korunması Bu kirliliği riskini en aza indirmek adına malzemelerin depolanması için belirlenmiş alanlar kullanılacak, inşaat sahalarında düzenli denetimler yapılacak, işçilere yönelik eğitimler düzenlenecek ve tortu tutucular yerleştirilecektir. Proje için herhangi bir yüzey suyu çekimi yapılmayacaktır. İnşaat faaliyetleri ve toz bastırma için su ihtiyacı mevcut belediye hatlarından sağlanacaktır. İlçe merkezinde bulunan Söğütli Çayırı’nın projeden etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınacaktır.	Yeraltı Sularının Korunması İnşaat işçileri ve ilgili personel, dökülmeye müdahale ve önleme tedbirleri konusunda düzenli olarak eğitilecektir. Sıvı malzemelerin depolandığı alanlara drenaj sistemleri döşenecektir. Herhangi bir dökülme olması durumunda yeraltı suyunun kirlenmesini önlemek için sıvı malzemelerin depolandığı alanların drenaj sistemleri dökülme ve sızıntıların yağmurlu suyu sistemine ulaşmasını engelleyecek şekilde tasarlanacaktır. Üst Toprağın Korunması Kazı ve inşaat faaliyetleri başlamadan önce, üst toprak (bitki örtüsü, verimli toprak tabakası) ve alt toprağı ayırmak için sıyırma işlemi yapılacaktır. Üst ve alt toprak ayrı ayrı depolanacak ve bitkilendirme yoluyla uzun vadede olası erozyon ve çökme önlenecektir. Eğer kirlenmiş toprak olursa uygun lisanslı bir bertaraf sahasında bertaraf edilecektir. Hafriyat ve Atık Yönetimi Kazı çalışmalarından çıkan hafriyat malzemeleri Elbistan Belediyesi tarafından izin verilen hafriyat depolama alanına taşınacaktır. Üst toprak ve hafriyat malzemesi burada ayrı ayrı depolanacak, uygun olması halinde, bu malzeme proje sahasında dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır. Mümkün olduğunda, hammaddelerin geri kazanımı ve yeniden kullanımı yoluyla atık miktarının ve hammadde kullanımının en aza indirilmesine öncelik verilecektir. Atıkların geri dönüşümü, taşınması ve bertarafı lisanslı şirketler ve/veya ilgili belediyeler aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Kültürel Miras Kazı çalışmaları sırasında arkeolojik kalıntılara rastlanması halinde, çalışmalar durdurulacak ve ilgili kurumlarla iletişime geçilecektir.
---	--	--

10.4. Şikayet Formları

Şikayet Kategorisi			Toplam				Raporlama Dönemi			
			Kayıtlı	Beklemede*	Açık	15 iş gününden fazla açık	Kayıtlı	Beklemede*	Açık	15 iş gününden fazla açık
Takdirler										
Sorgular										
Talepler										
Şikayetler ve Endişeler	Mühendislik	Yanlış mühendislik uygulaması/tasarımı								
		Asfaltlamanın önceliklendirilmesi								
		İnşaat işlerinin yavaş ilerlemesi								
	Çevresel	Tehlikeli atıkların bertarafı								
		Tehlikeli olmayan atıkların bertarafı								
		Toz/Çamur								
		Habitat/kültür koruma altındaki yapılar üzerindeki etkiler								
		Gürültü								
		Koku								
		Rastgele yağma yığınları								
		Diğer Konular								
		Arazi ve Geçim Kaynakları	Yasadışı arazi edinimi							
			Geçim kaynakları üzerindeki etkiler							
	Sosyal	Toplum sağlığı ve güvenliği								
		Kişisel varlıklarda hasar								
		Kamu hizmetlerinin aksaması								
		Estetik								
		Proje personelinin uygunsuz davranışları								
		İş sağlığı ve güvenliği								
		Çalışma saatleri								
		Diğer Konular								
TOPLAM										

* Kapanış süresi şikayetçi ile mutabakat sağlanarak uzatılır

